




Expansão Imóvel Itajaí/SC

Setembro de 2025

Raizz Renda Logística FII
CNPJ: 35.652.278/0001-28



APRESENTAÇÃO

Imóvel Itajaí/SC – Projeto 3D


Documento Confidencial



APRESENTAÇÃO

Expansão Imóvel Itajaí/SC – Fase II – Galpão G2

Documento Confidencial

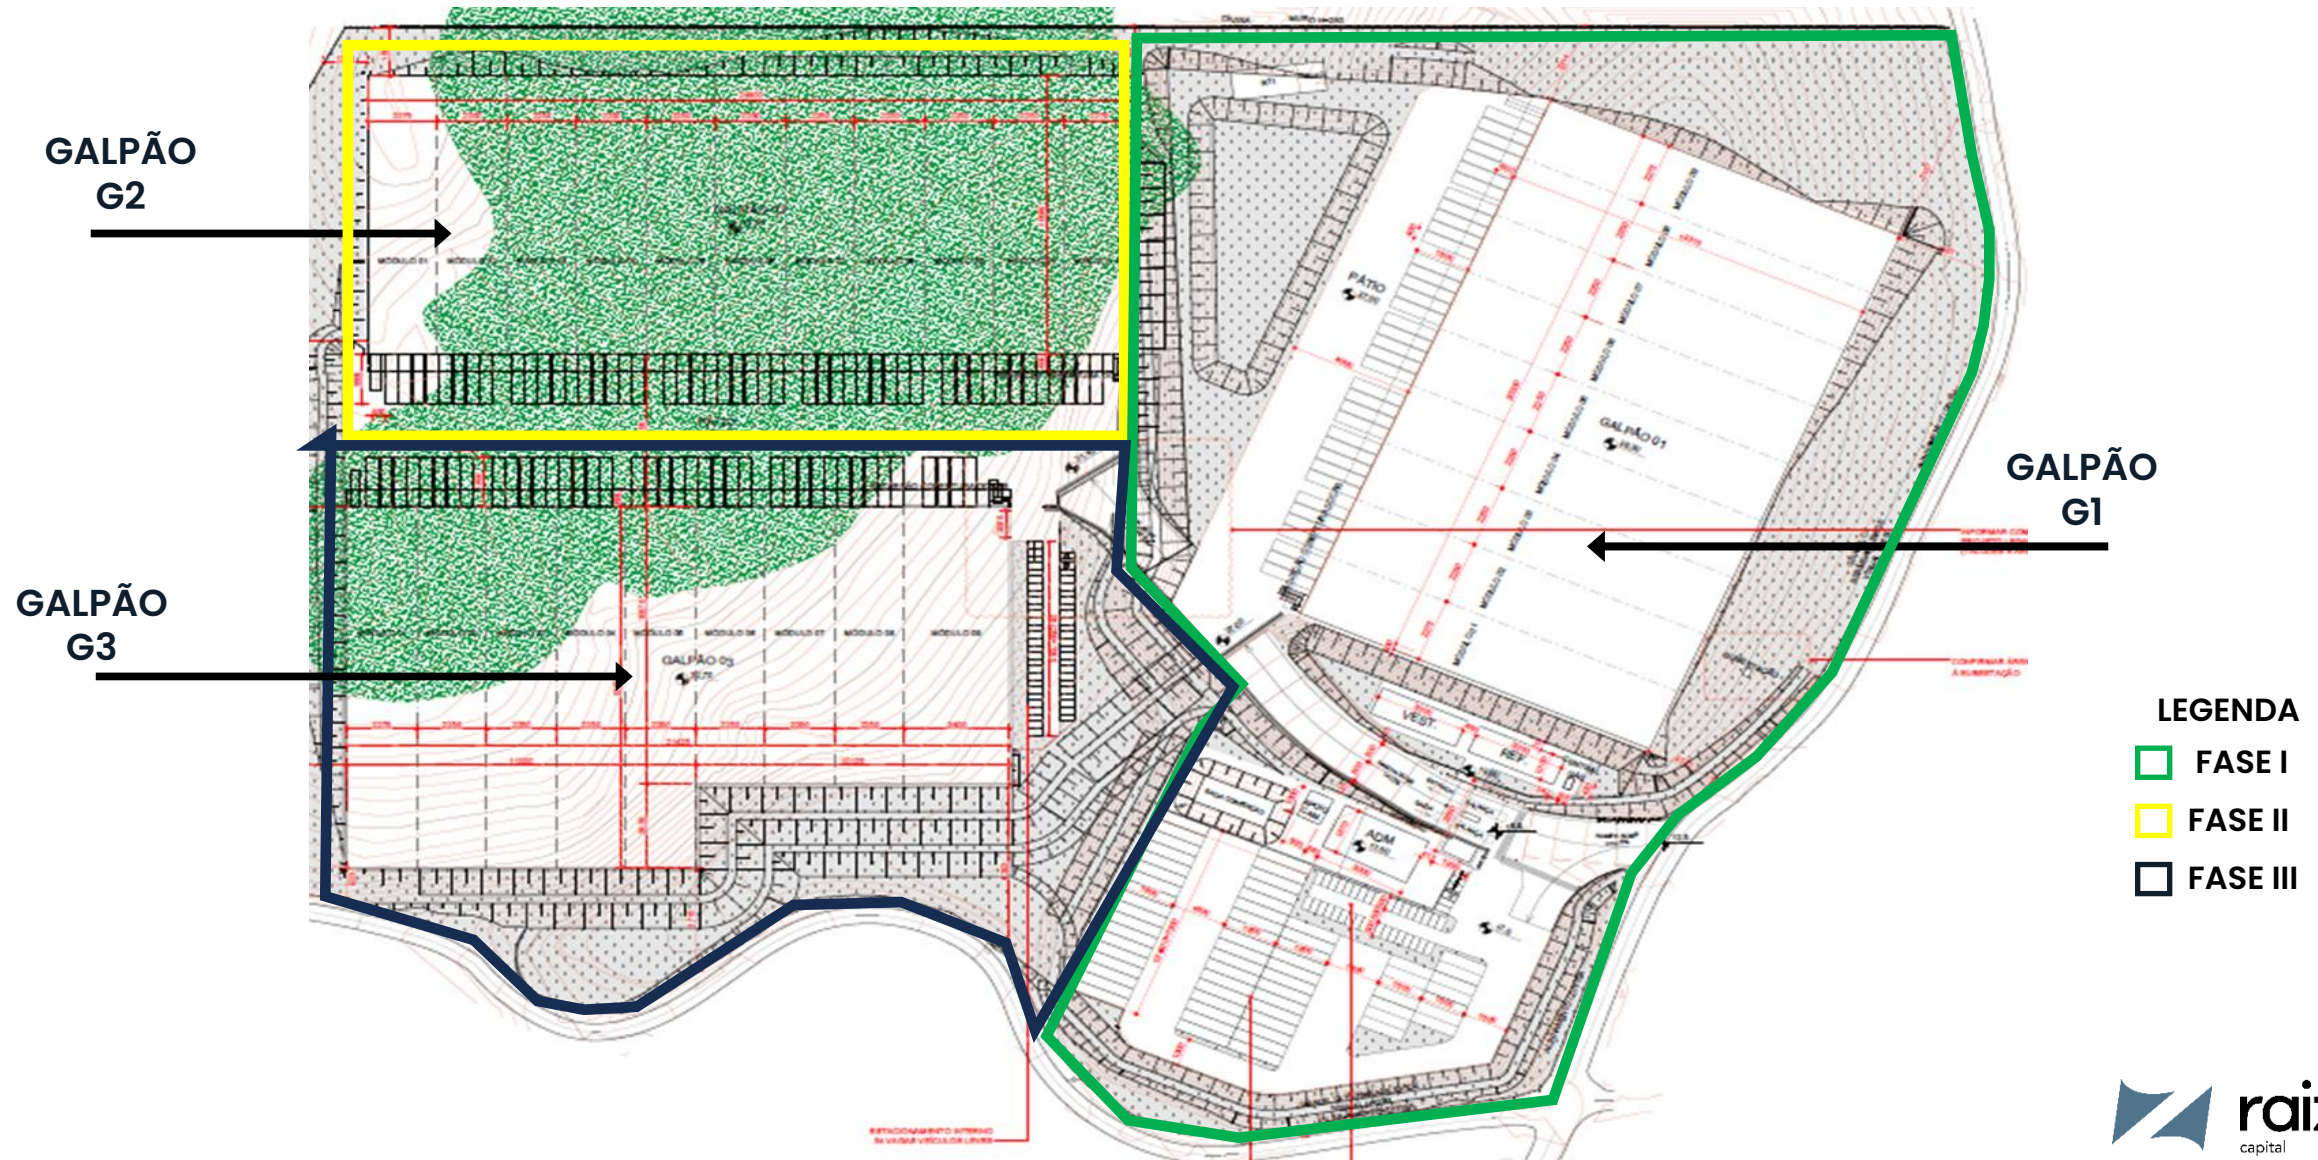

PROJETOS

Projeto x Foto

Documento Confidencial




ATUALIZAÇÃO

Cronograma Físico – Financeiro – Galpão G2

Documento Confidencial

ACOMPANHAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO - Raizz ZFLOG - FASE II / SC -Agosto/2025

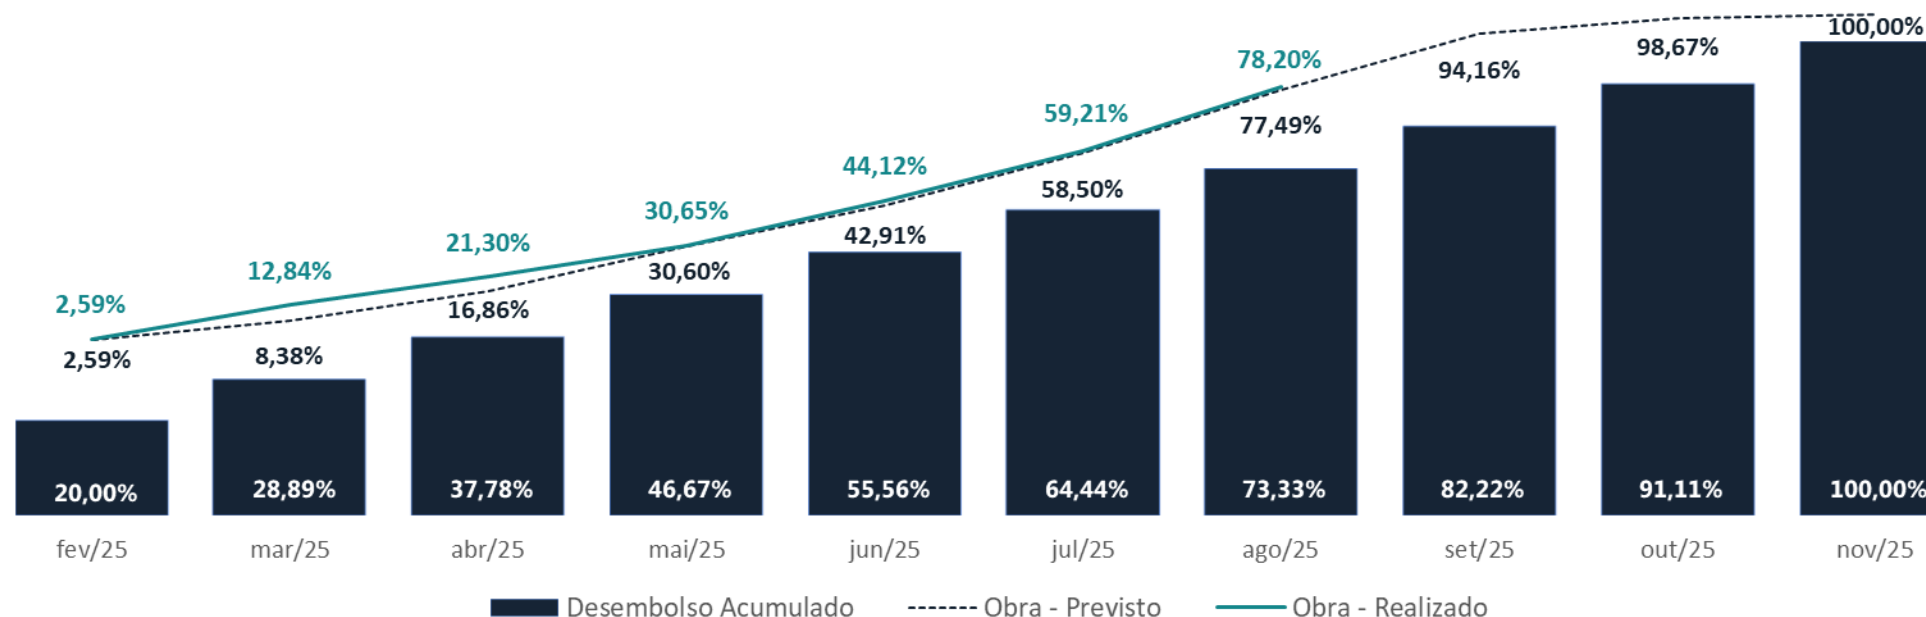


DESTAQUES DO MÊS

Expansão Imóvel Itajaí – Galpão G2

Documento Confidencial

- ▶ Telhado finalizado.
- ▶ Piso galpão em andamento.
- ▶ Pátio em andamento.
- ▶ Instalações elétricas em andamento.
- ▶ Prevenção ao incêndio em fase de teste.

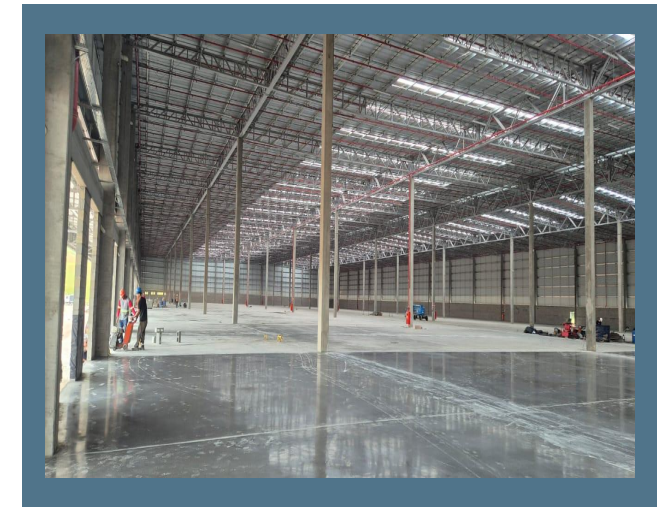

AVANÇO DA OBRA

Fotos Panorâmicas

Documento Confidencial



11/08/2025



04/09/2025

AVANÇO DA OBRA

Fotos Panorâmicas

Documento Confidencial



11/08/2025




04/09/2025

AVANÇO DA OBRA

Alvenaria


Documento Confidencial

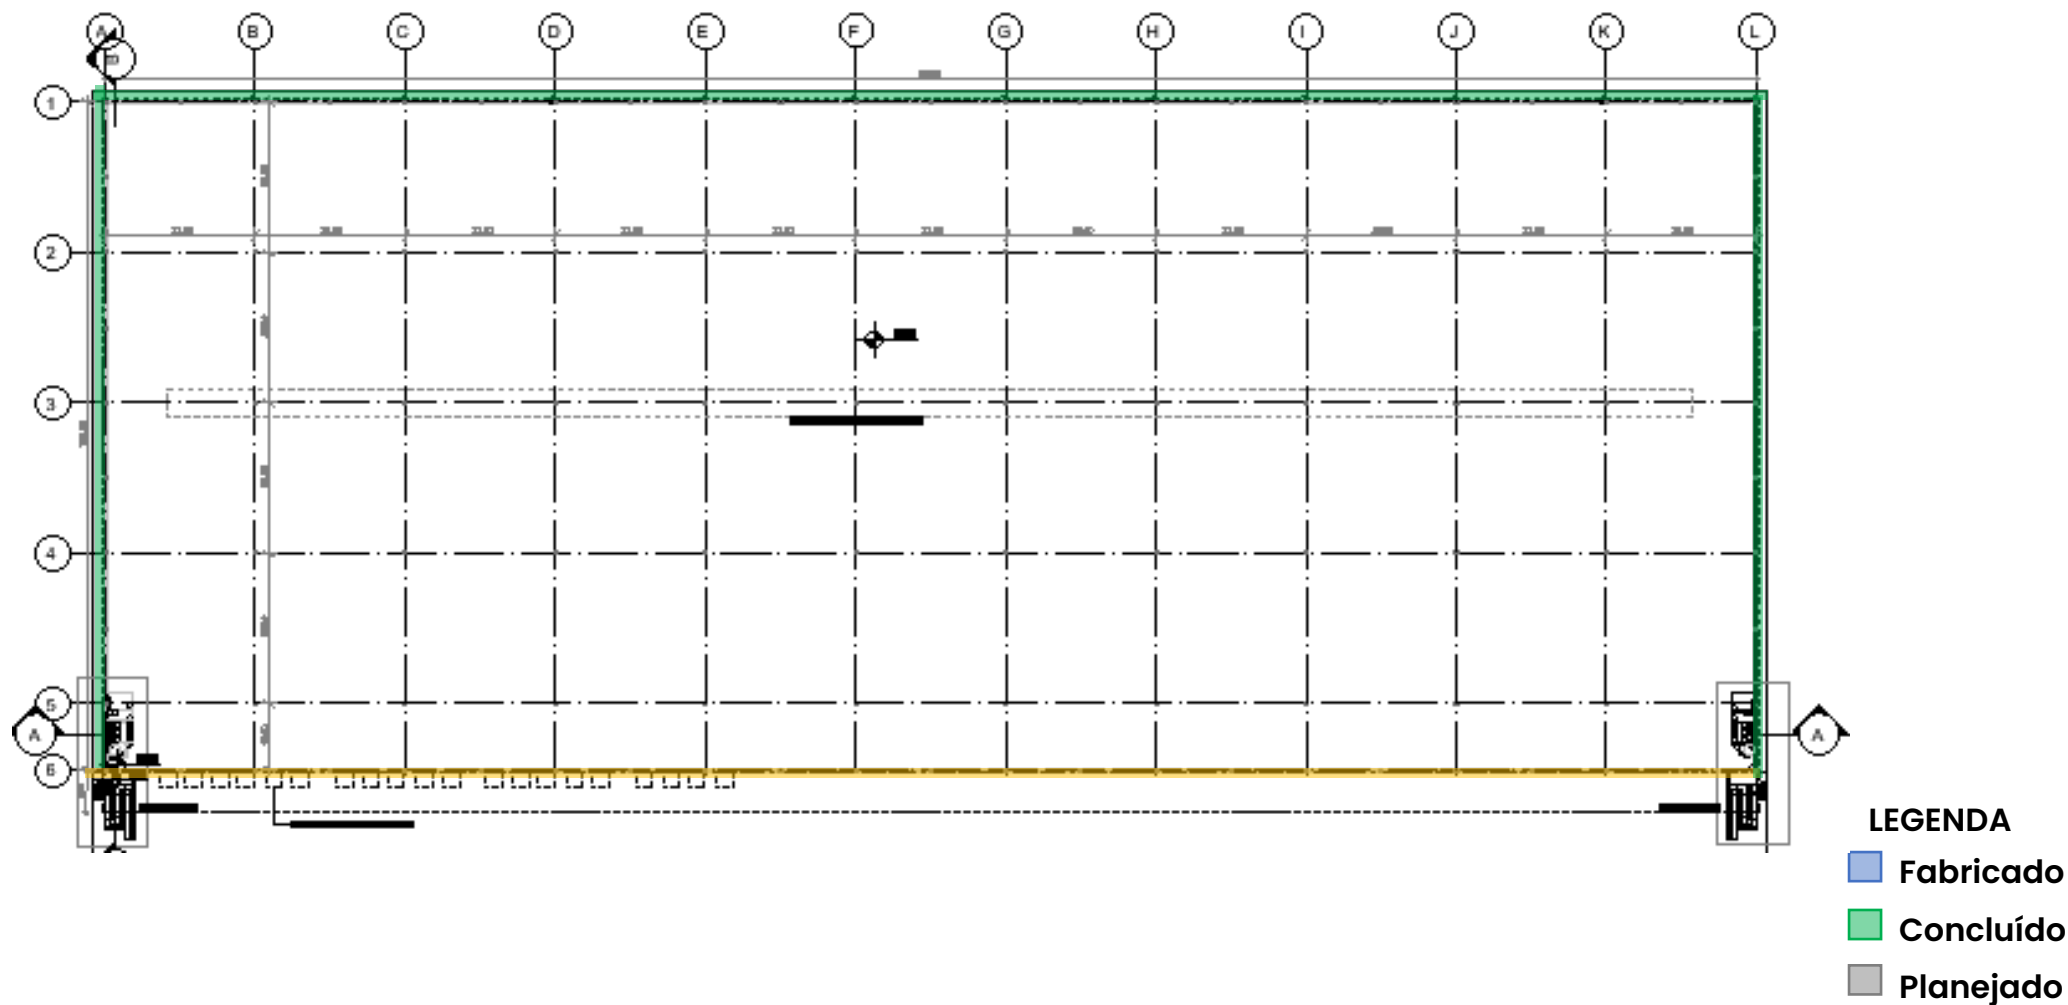

AVANÇO DA OBRA

Alvenaria

Documento Confidencial

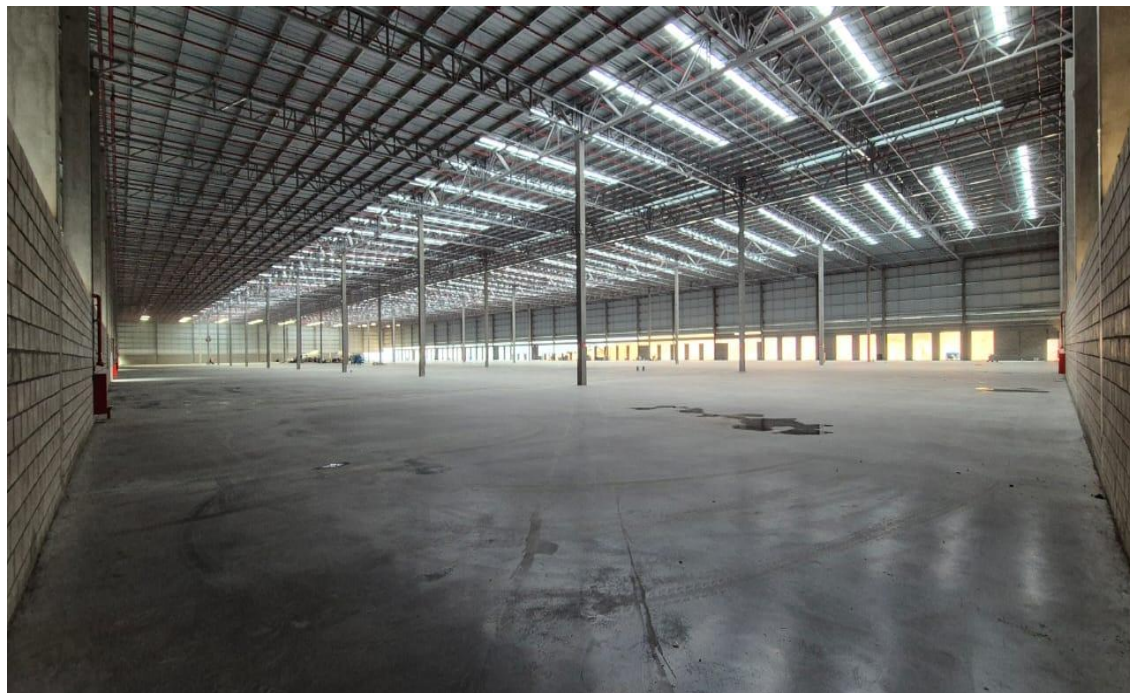


Montagem da estrutura pré-moldada do muro de arrimo das docas do galpão em andamento.

AVANÇO DA OBRA

Piso

Documento Confidencial

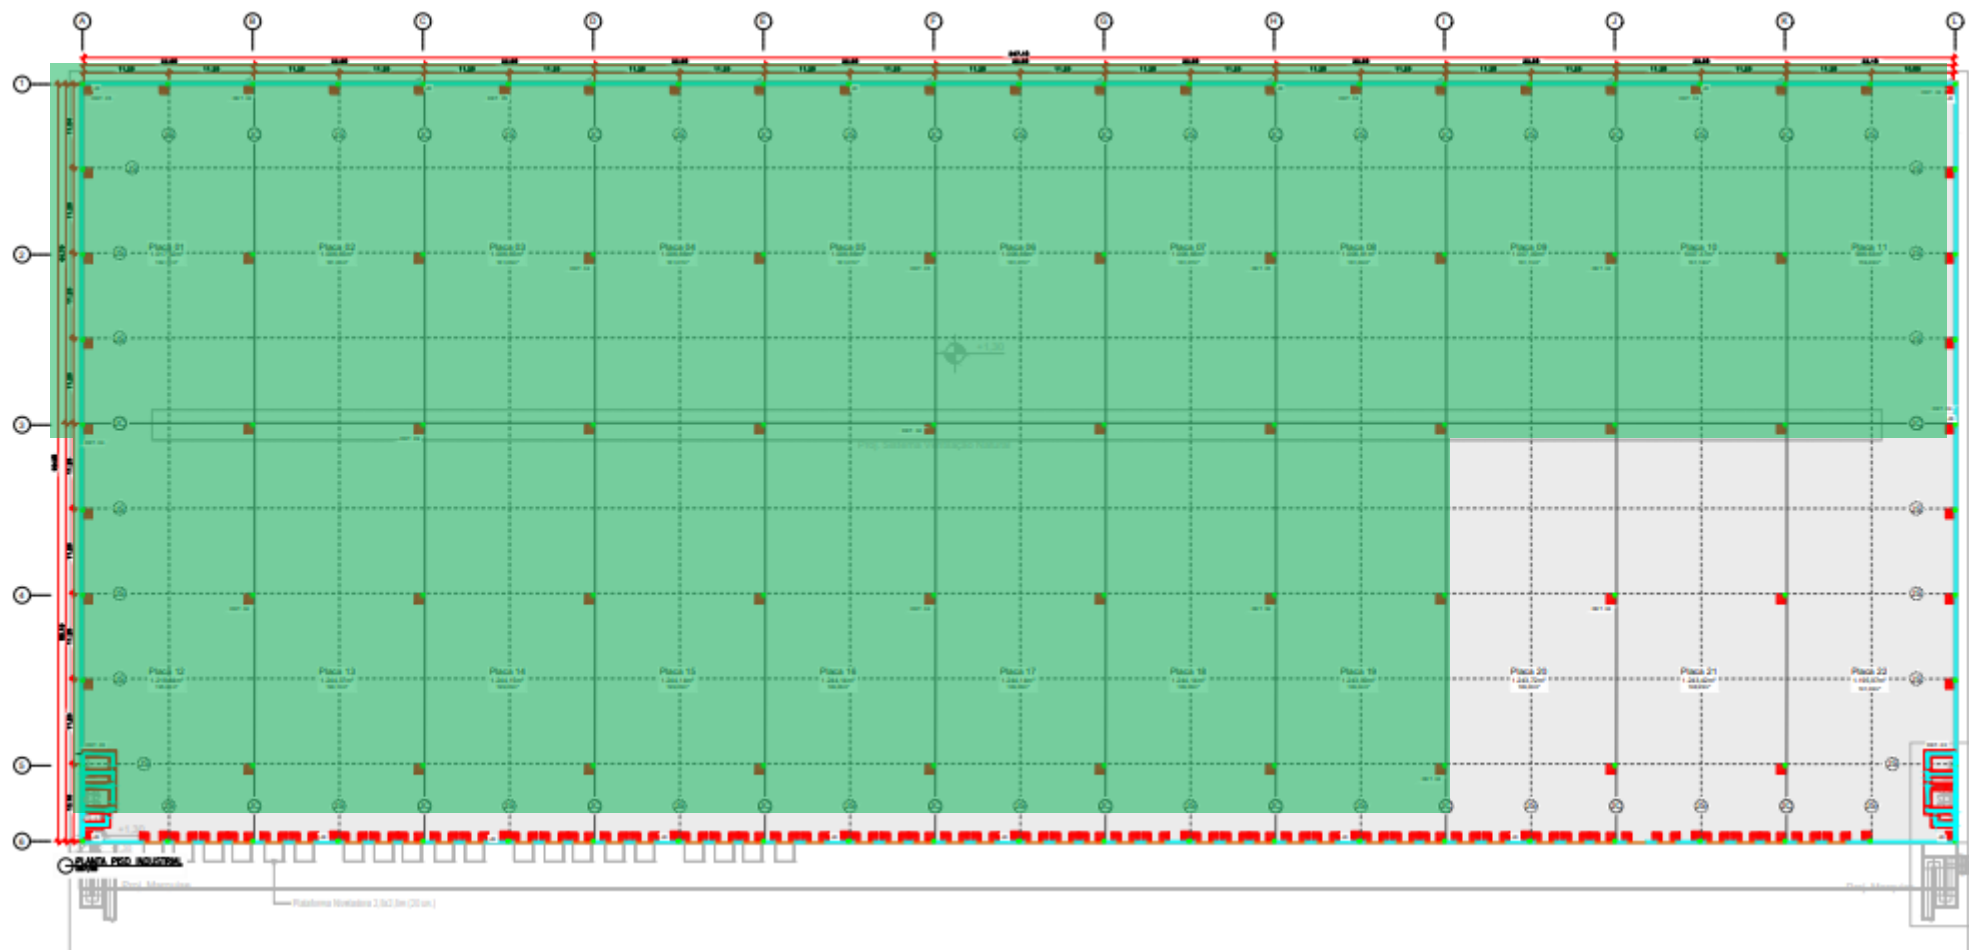


LEGENDA

- Em andamento
- Concluído
- Planejado

AVANÇO DA OBRA

Piso

Documento Confidencial

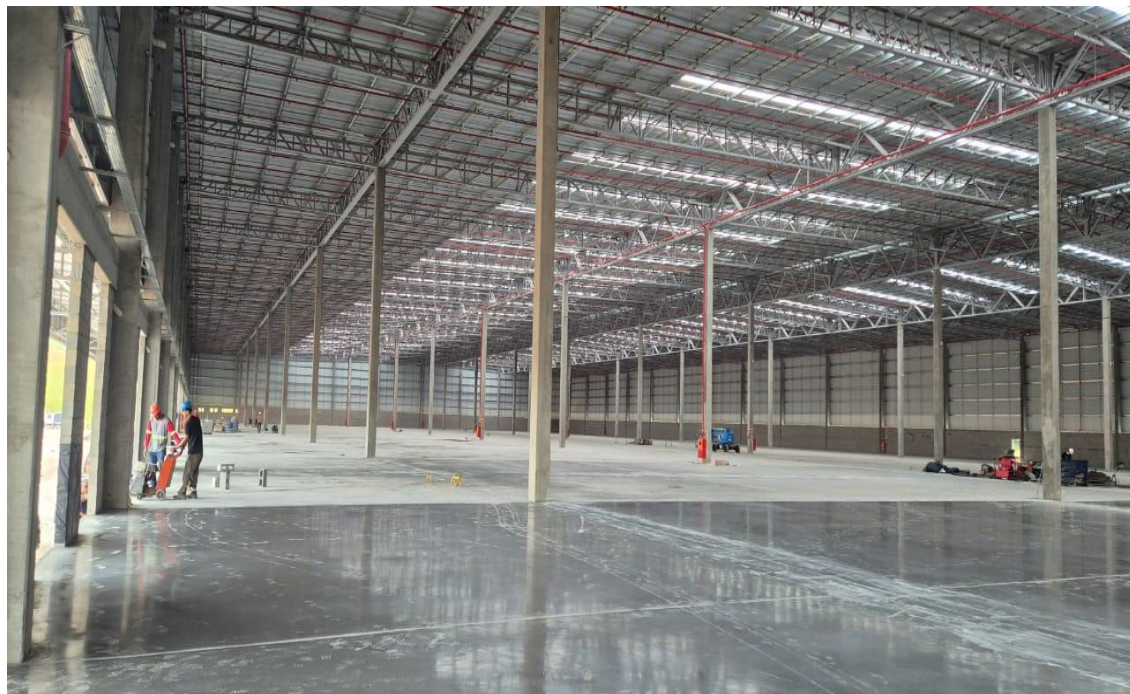


Execução do piso do galpão em andamento.

AVANÇO DA OBRA

Instalações de Incêndio

Documento Confidencial

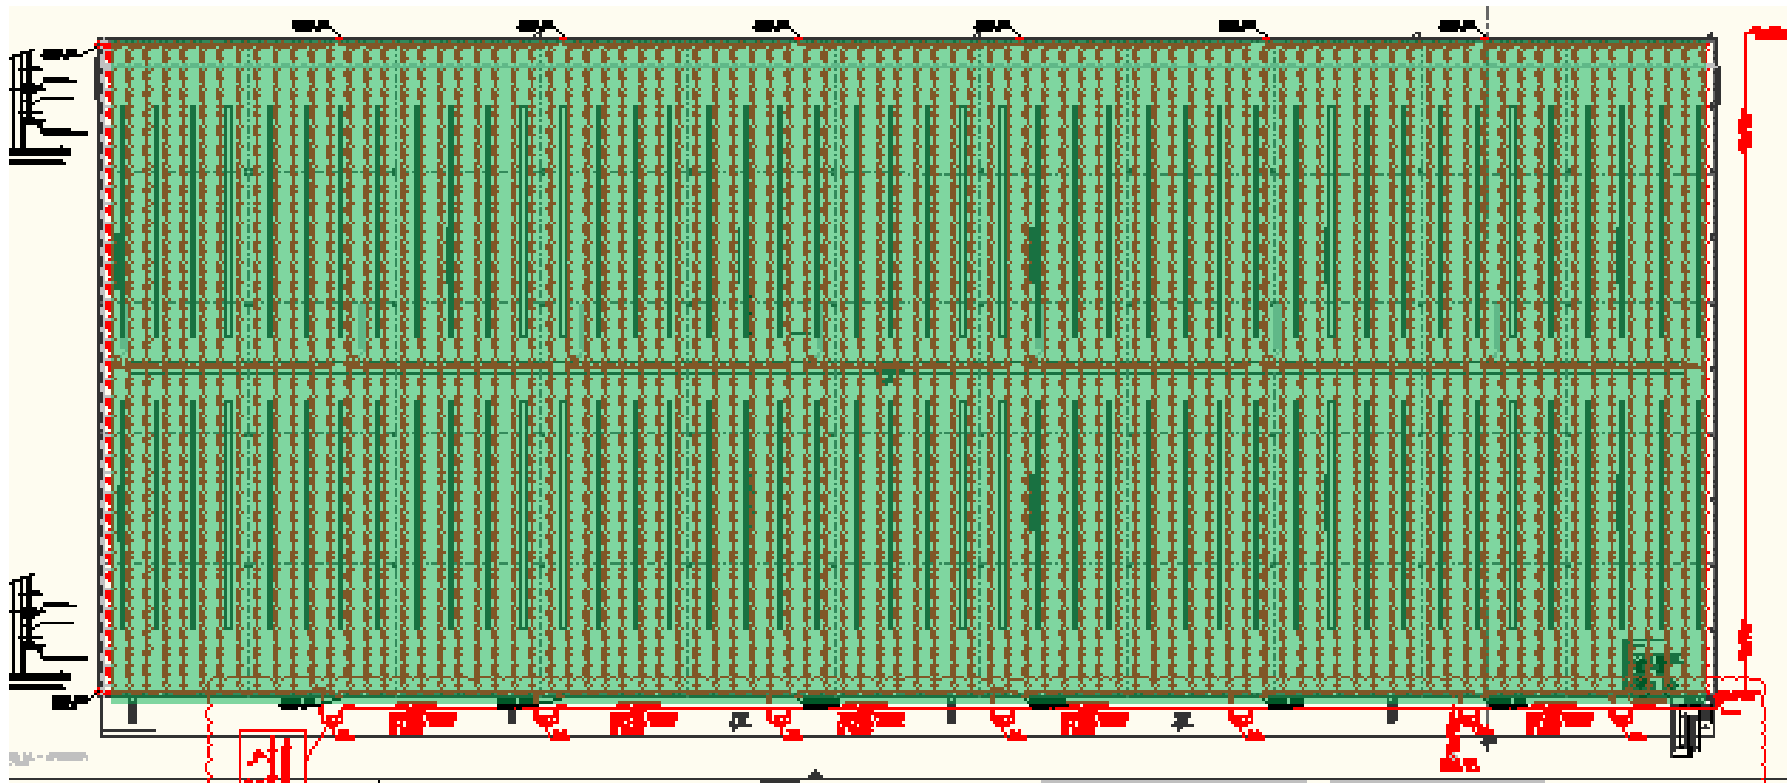

LEGENDA

- Em andamento
- Concluído
- Planejado

AVANÇO DA OBRA

Instalações de Incêndio

Documento Confidencial




Instalação da tubulação de sprinklers e hidrantes do sistema de prevenção e combate ao incêndio do galpão em fase de testes.

AVANÇO DA OBRA

Instalações de elétrica

Documento Confidencial

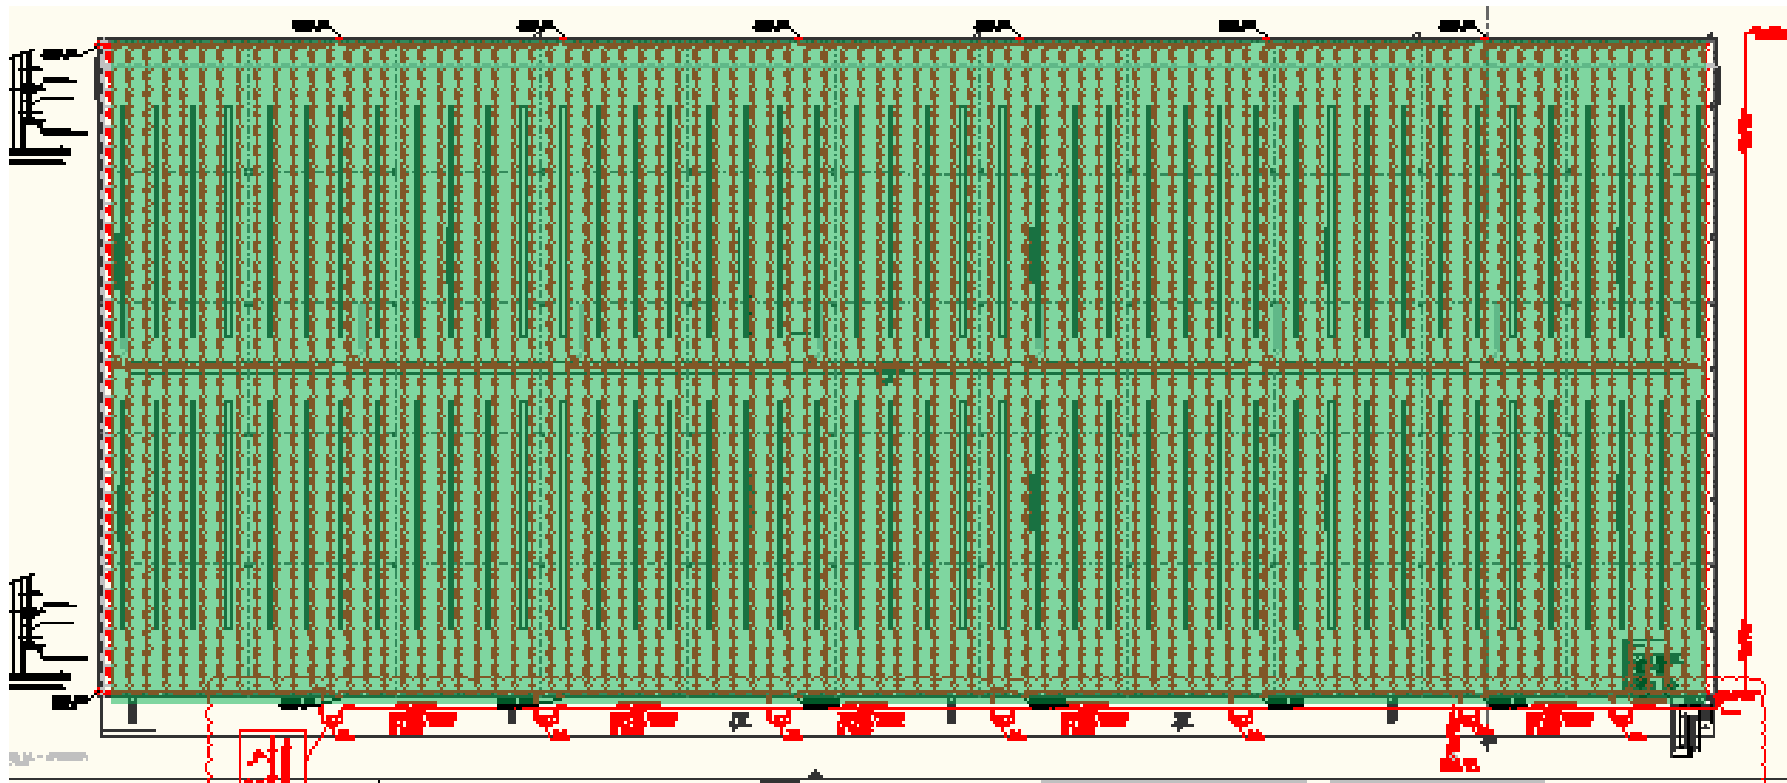


LEGENDA

- Em andamento
- Concluído
- Planejado

AVANÇO DA OBRA

Instalações de elétrica

Documento Confidencial

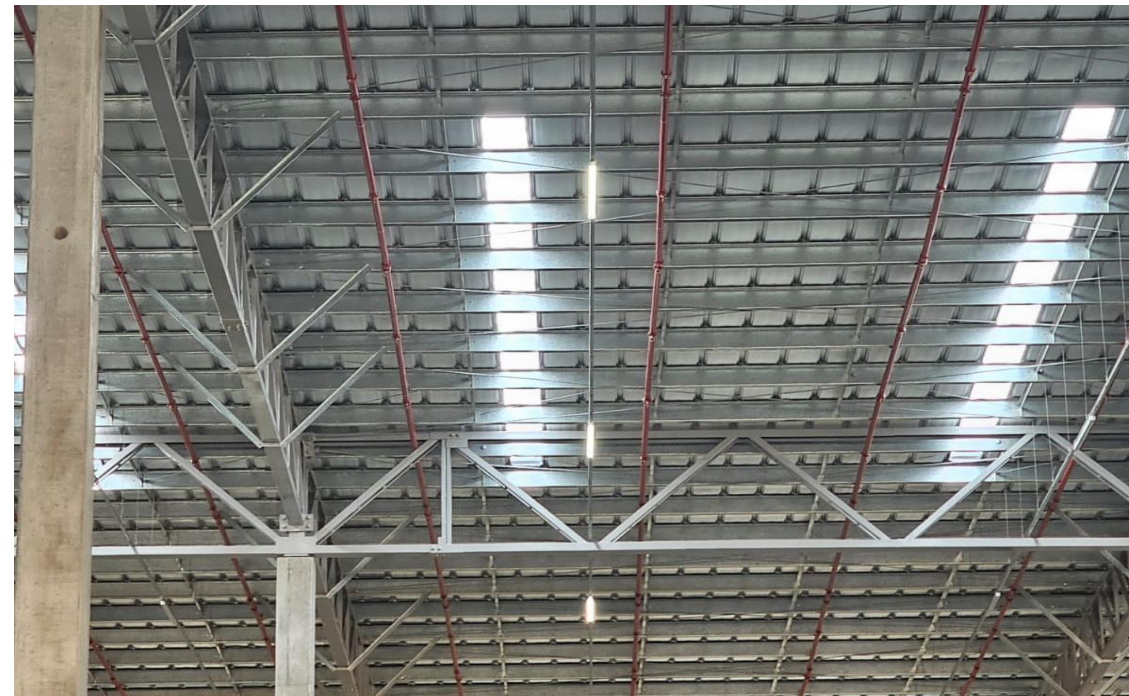


Instalação da elétrica e iluminação em fase final.

AVANÇO DA OBRA

Subleito e Base do Pátio

Documento Confidencial

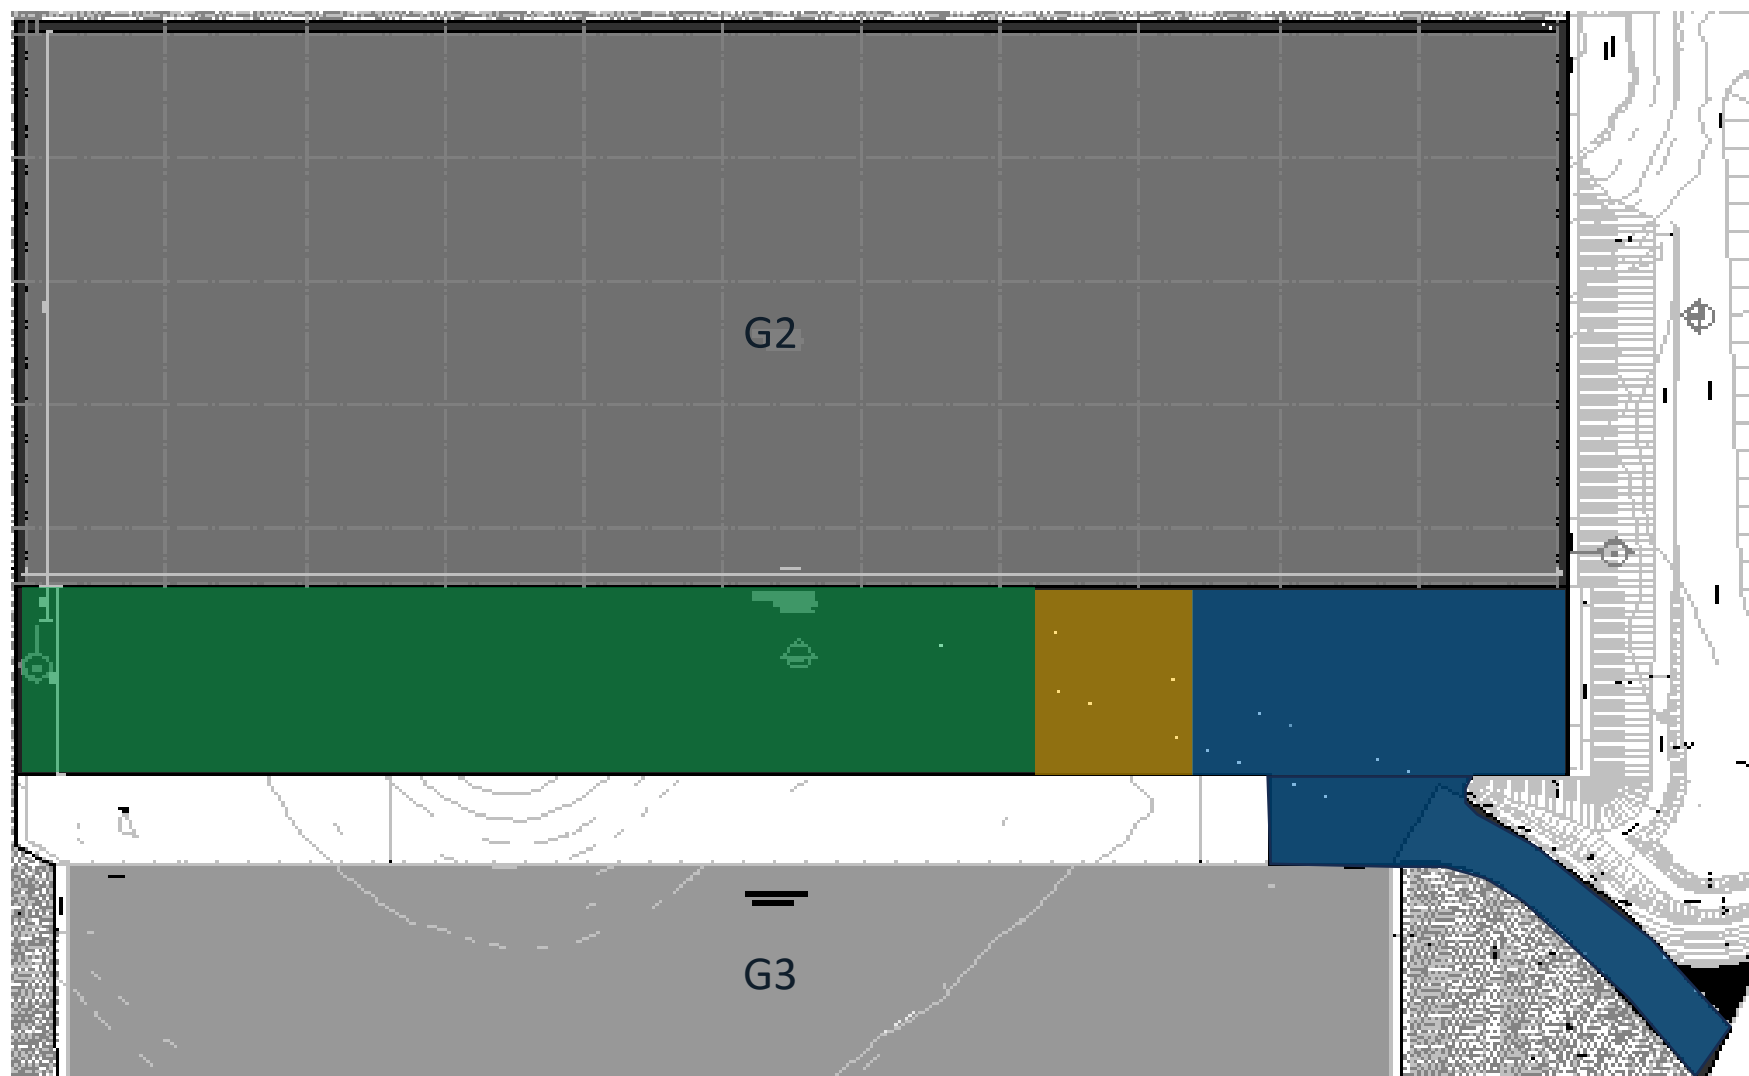

LEGENDA

- Planejado
- Em andamento
- Concluído

AVANÇO DA OBRA

Subleito e Base do Pátio

Documento Confidencial



Execução do pátio em andamento.

Contato

VISITE

www.raizzcapital.com.br

contato@raizzcapital.com.br

TELEFONE

+55 (31) 3183-0995

ENDEREÇO

Av. Getúlio Vargas, 258
Funcionários | CEP 30112-020
Belo Horizonte | MG | Brasil

Rua João Pessoa de Matos, 330
Praia da Costa, Sala 705
CEP 29101-115 | Vila Velha | ES | Brasil

