JULHO | 2026

RELATÓRIO GERENCIAL

TRIPLO A RESIDENCIAL

TRIP11 · Open Kapital



Imagem do projeto meramente ilustrativa, sujeitas a alterações.
As imagens são de propriedade do fundo e não podem ser reproduzidas, distribuídas ou divulgadas sem prévia autorização.



Índice

Sobre o Fundo	03
Tese de Investimento	06
Principais Destaques	13
Monitoramento de Mercado	18
Composição da Carteira	20
Acompanhamento de Obras	24
Acompanhamento Pluviométrico	27
Localização	31
Ficha Técnica	34


Imagem do projeto meramente ilustrativa, sujeitas a alterações.
As imagens são de propriedade do fundo e não podem ser reproduzidas, distribuídas ou divulgadas sem prévia autorização.



01

Sobre o Fundo

As imagens são de propriedade do fundo e não podem ser reproduzidas, distribuídas ou divulgadas sem prévia autorização.

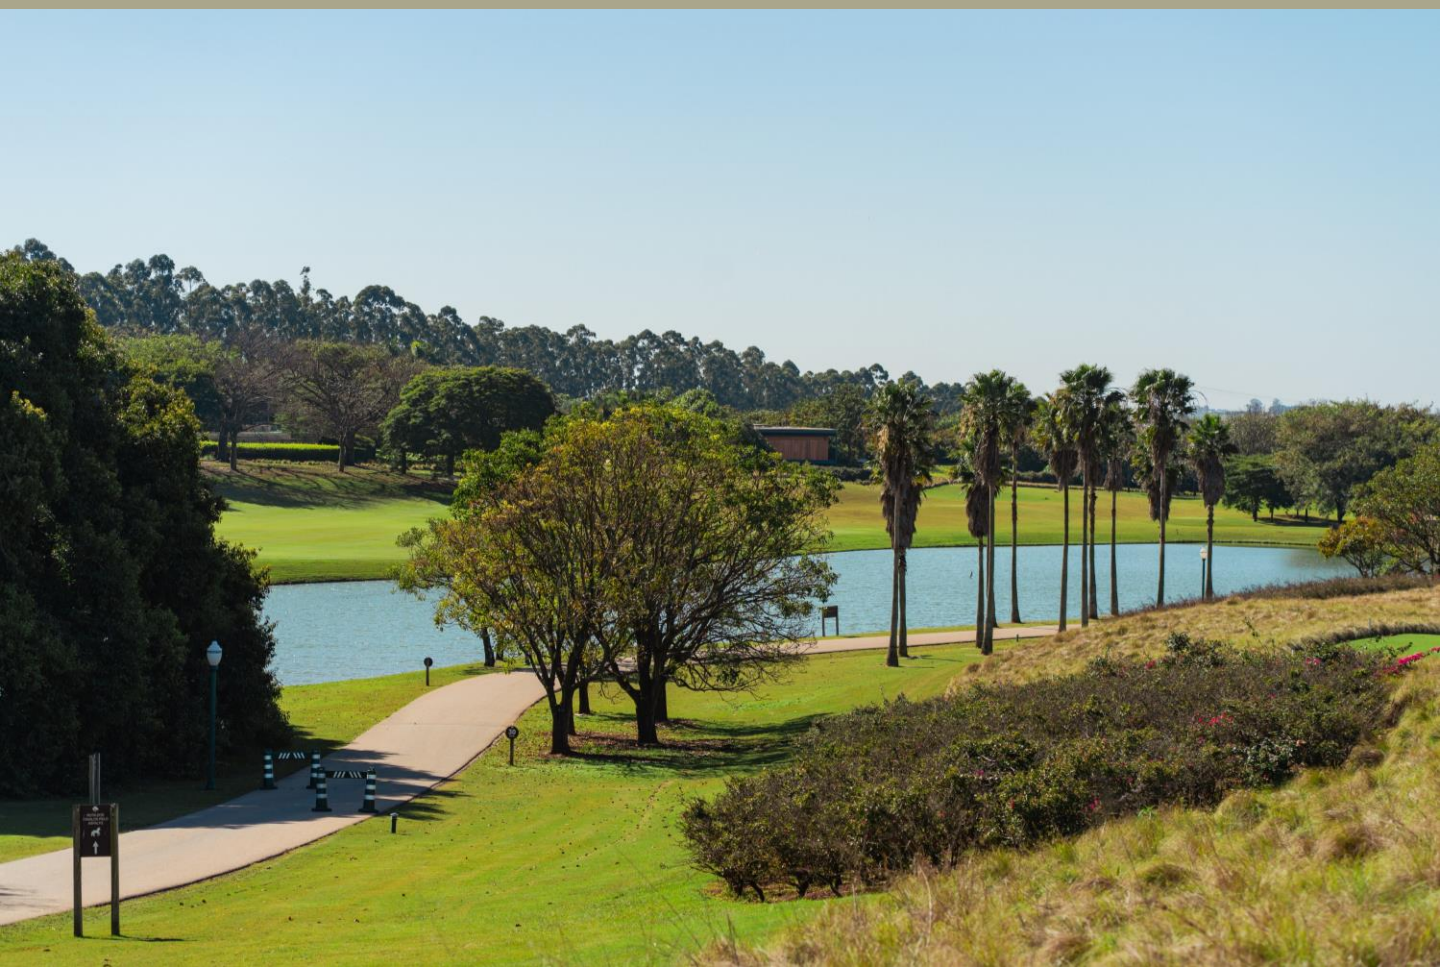

O TRIPLO A Residencial (TRIP11)

É um fundo imobiliário voltado ao investimento em residências de alto luxo na Fazenda Boa Vista (SP) e Trancoso (BA). O Fundo busca gerar retorno aos cotistas através da aquisição, desenvolvimento e venda de imóveis com arquitetura autoral, alta liquidez e inseridos em regiões de oferta estruturalmente restrita, o que reforça o potencial de valorização do portfólio.

R$ 105,23
Cota Patrimonial

R$ 175 milhões
Patrimônio Líquido

2.353
Número de Cotistas

1.664.396
Quantidade de Cotas

As imagens são de propriedade do fundo e não podem ser reproduzidas, distribuídas ou divulgadas sem prévia autorização.

O TRIPLO A Residencial (TRIP11)

INÍCIO DO FUNDO	10/2025
ADMINISTRADORA	XP ADMINISTRAÇÃO
GESTORA	OPEN KAPITAL
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,80% AO ANO
TAXA DE PERFORMANCE	20% DO QUE EXCEDER IPCA + 7,0% AO ANO
CÓDIGO DO FUNDO	TRIP11
TIPO ANBIMA	DESENVOLVIMENTO PARA VENDA GESTÃO ATIVA
PRAZO	3 ANOS
PÚBLICO ALVO	GERAL

O Portfólio

O portfólio do Fundo reflete uma estratégia de diversificação por localização e estágio de desenvolvimento dos ativos imobiliários, combinando investimentos em terrenos destinados ao desenvolvimento imobiliário e em casas em fase final de obras. Os recursos ainda não alocados em ativos imobiliários permanecem temporariamente aplicados em títulos públicos federais, preservando a liquidez do Fundo até sua efetiva alocação, sendo integralmente destinados ao cumprimento dos futuros desembolsos de capital relacionados às obras e às despesas das operações.



02

Tese de Investimento

As imagens são de propriedade do fundo e não podem ser reproduzidas, distribuídas ou divulgadas sem prévia autorização.





Trancoso

Fazenda Boa Vista

FUNDO COM FOCO EM RESIDÊNCIAS DE ALTO PADRÃO

Visando ganho de capital, com distribuição de recursos aos cotistas por meio da venda individual dos ativos.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS RESIDENCIAIS EXCLUSIVOS EM REGIÕES CONSOLIDADAS DE ALTÍSSIMO PADRÃO

Como Trancoso (BA) e Fazenda Boa Vista (SP), com arquitetura autoral e execução por parceiros com reconhecida experiência no segmento de alto luxo.



Ciclo de Investimento

01

AQUISIÇÃO

Compra de Ativos de Luxo via rede de relacionamentos exclusivo, com originação *off market*.

02

DESENVOLVIMENTO

Desenvolvimento do ativo com projetos assinados por arquitetos e paisagistas renomados.

03

VENDA

Comercialização do imóvel pronto ou durante a obra, sempre como produto único e exclusivo.

As imagens são de propriedade do fundo e não podem ser reproduzidas, distribuídas ou divulgadas sem prévia autorização.



TESE DE INVESTIMENTO

Fazenda Boa Vista

As imagens são de propriedade do fundo e não podem ser reproduzidas, distribuídas ou divulgadas sem prévia autorização.

Fazenda Boa Vista

É um dos empreendimentos de ultra luxo mais consolidados do país, combinando privacidade, segurança e infraestrutura de padrão internacional. Sua valorização é sustentada pela oferta restrita e pela presença de amenidades exclusivas.

A proximidade com São Paulo e com o Aeroporto Internacional de Campinas impulsiona a demanda por residências de alto padrão, em um movimento crescente de famílias transformando a Boa Vista em primeira residência.



HOTEL FASANO



CAMPO DE GOLFE 1 – RANDALL THOMPSON



ÁREA ESPORTIVA | QUADRAS DE TÊNIS



BOA VISTA MARKET

As imagens são de propriedade do fundo e não podem ser reproduzidas, distribuídas ou divulgadas sem prévia autorização.



TESE DE INVESTIMENTO

Trancoso


Trancoso

Consolidou-se como um dos destinos mais desejados do Brasil, combinando belezas naturais, cultura local vibrante e uma cena imobiliária marcada por projetos exclusivos, arquitetura autoral e oferta muito limitada.

Os principais eixos de valorização — Quadrado Histórico, Terravista, Itapororoca e Altos de Trancoso — formam um cluster único de alta renda, atraindo compradores brasileiros e internacionais.



PRAIA DOS NATIVOS

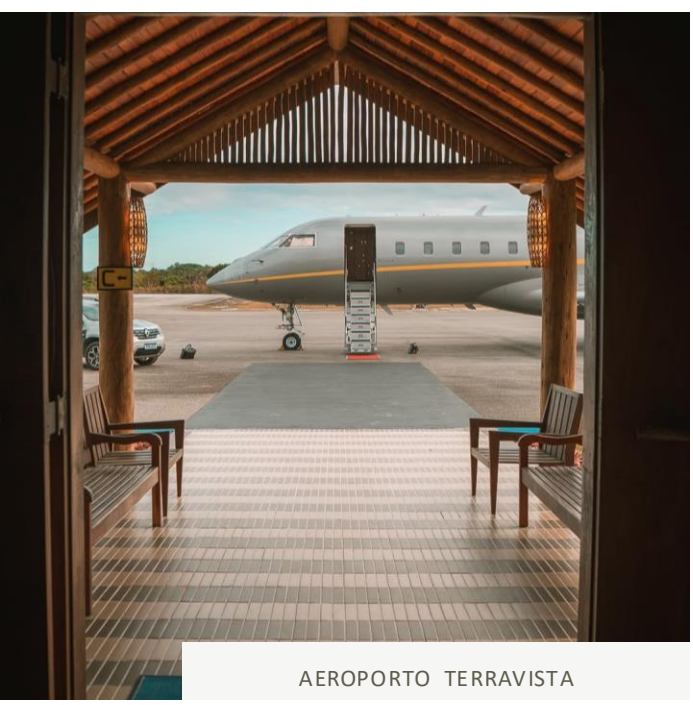

AEROPORTO TERRAVISTA



HOTEL FASANO



QUADRADO HISTÓRICO



03

Principais Destaques

As imagens são de propriedade do fundo e não podem ser reproduzidas, distribuídas ou divulgadas sem prévia autorização.

Principais Destaques

Julho 2026

Ao longo do mês de julho, a Fazenda Boa Vista permaneceu fechada em razão do período de férias do condomínio, restringindo temporariamente a entrada de prestadores de serviços e as atividades que dependiam de acesso físico aos terrenos. Durante o período, a gestão manteve o avanço das frentes de planejamento, desenvolvimento técnico e estruturação necessárias ao início das obras.

No período, foi concluída a etapa de Projeto Executivo de Arquitetura das três residências, consolidando as principais definições arquitetônicas e ampliando a previsibilidade para o desenvolvimento das disciplinas complementares e para a fase de execução.

Um dos principais marcos do mês foi a conclusão do processo estruturado de concorrência e a seleção da construtora responsável pela execução das três residências da Fazenda Boa Vista. O processo contou com cinco construtoras de referência no segmento de alto padrão e foi conduzido em duas rodadas, por meio de metodologia estruturada de avaliação, com critérios técnicos (60%) e comerciais (40%).

Diferentemente de uma concorrência baseada predominantemente em preço, as participantes desenvolveram planos de execução a partir dos projetos e premissas estabelecidos pelo Fundo, permitindo comparar diferentes estratégias construtivas, cronogramas, estruturas operacionais, soluções de engenharia de valor e planejamentos logísticos para a condução simultânea das três obras.

Principais Destaques

Julho 2026

Ao final do processo, uma única construtora foi selecionada após apresentar maior aderência ao conjunto de critérios estabelecidos pelo Fundo. Entre os diferenciais observados, destacaram-se a profundidade do planejamento executivo, a estrutura proposta para condução simultânea das obras, os estudos de engenharia de valor e o planejamento logístico de compras, elementos que contribuem para maior previsibilidade de custos, prazos e execução. Com a conclusão da seleção, foi iniciada a etapa de negociação e formalização contratual.

Paralelamente, foram recebidos os laudos de sondagem dos terrenos, permitindo o avanço dos projetos de estruturas e fundações para a etapa pré-executiva. Também foi concluída a contratação do projeto complementar de iluminação, ampliando a consolidação das disciplinas técnicas das três residências.

A conclusão dessas frentes encerra uma etapa relevante de preparação dos empreendimentos e estabelece as condições para o avanço à fase de obras, com início previsto para o mês subsequente.

Evolução dos Ativos

Evolução da estruturação técnica com foco em previsibilidade de custo, prazo e qualidade

Out 2025 a Mai 2026 | FAZENDA BOA VISTA | PORTO FELIZ SP

01 Aquisição dos Lotes e Estruturação Técnica Inicial

Out a Dez 2025

Base técnica padronizada estabelecida para os ativos, garantindo consistência e eficiência na evolução dos projetos.

- Consolidação fundiária dos terrenos
- Definição das premissas técnicas dos projetos
- Estruturação do processo competitivo

02 Desenvolvimento Técnico e Estudos Preliminares

Jan a Mar 2026

Consolidação da estrutura técnica dos projetos, com avanço dos estudos preliminares e início das atividades de pré-obra dos ativos.

- Seleção e contratação das equipes técnicas
- Definição de diretrizes e briefing dos projetos
- Desenvolvimento e validação dos estudos preliminares
- Início das atividades de pré-obra nos terrenos

03 Conclusão dos Anteprojetos e Concorrência Construtoras

Abr a Jun 2026

Avanço para etapa de Projetos Executivos e condução do processo de seleção da construtora;

- Inicio dos Projetos Executivos;
- Conclusão das etapas de pré-obra;
- Seleção da construtora responsável pelas obras;
- Início das negociações contratuais;
- Avanço no processo de contratação de disciplinas complementares remanescentes.

04 Conclusão dos Projetos Executivos e Contratação da Construtora

Jul 2026


Avanço dos projetos executivos e definição da estrutura para início das obras.

- Conclusão do projeto executivo de arquitetura;
- Contratação da construtora responsável pelos três ativos;
- Recebimento dos laudos de sondagem;
- Avanço dos projetos de estruturas e fundações.
- Contratação do projeto complementar de iluminação.

Para agosto de 2026, os ativos avançam para a preparação do canteiro de obras e o refinamento do orçamento, com foco na identificação de ganhos de eficiência.

Cronograma

O cronograma indicativo do ciclo dos imóveis do Fundo encontra-se apresentado abaixo. Os cinco ativos que compõem o portfólio atual foram adquiridos no 4T25. Os terrenos da Fazenda Boa Vista têm previsão de conclusão das obras e venda das residências no 4T27, enquanto as casas do empreendimento A MATA, em Trancoso, possuem previsão de conclusão de obra e venda no 3T26.

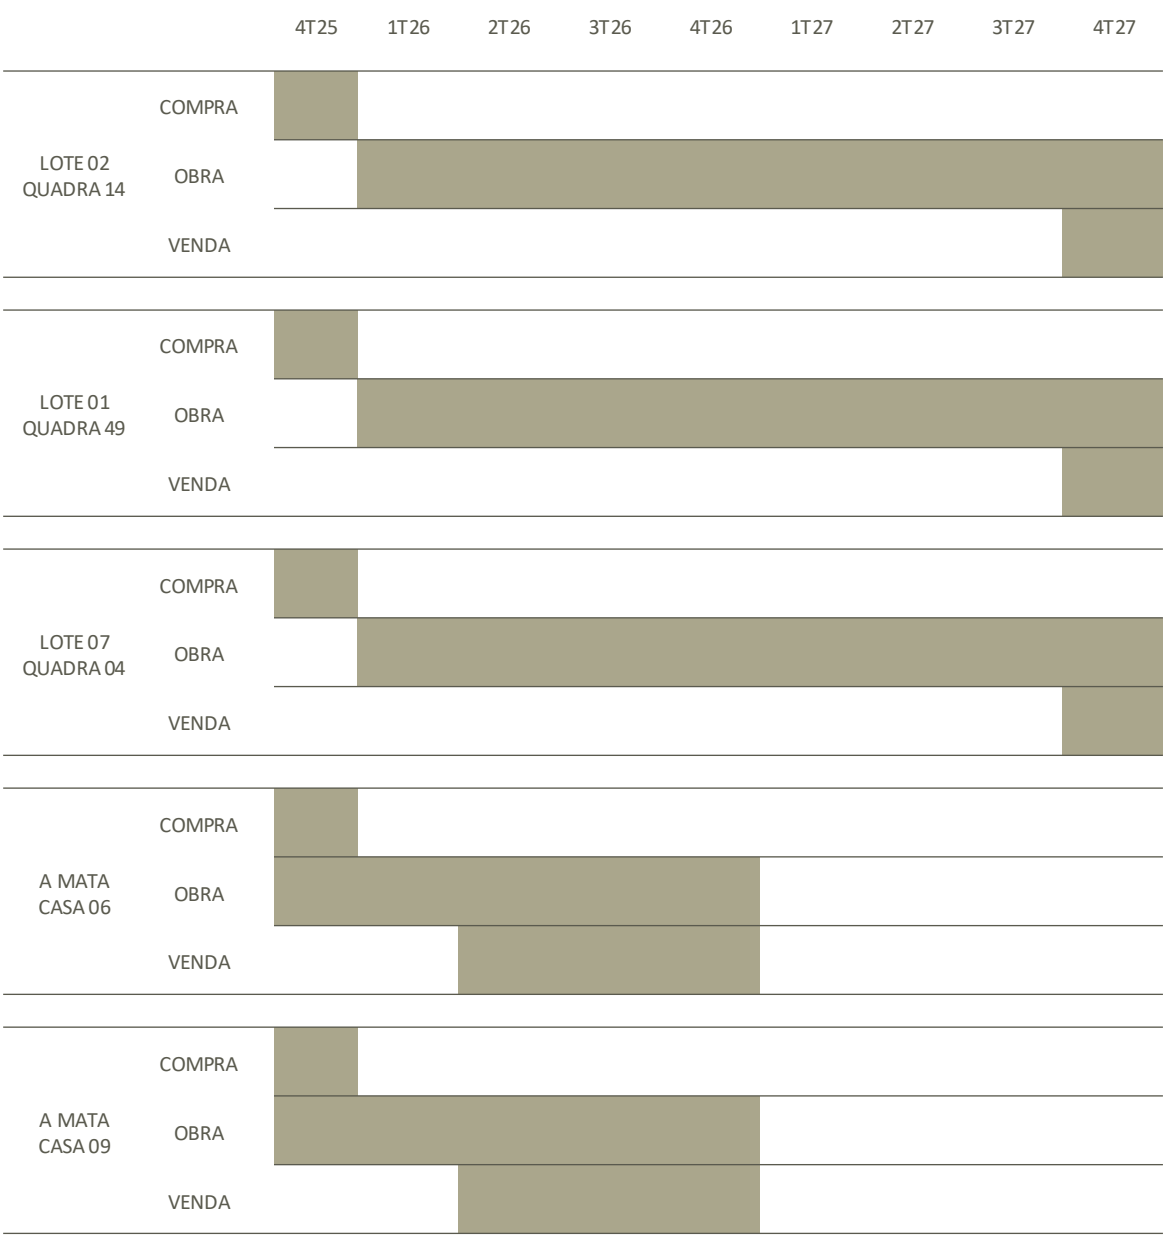




04

Monitoramento de Mercado

As imagens são de propriedade do fundo e não podem ser reproduzidas, distribuídas ou divulgadas sem prévia autorização.

Monitoramento de Mercado

Fazenda Boa Vista

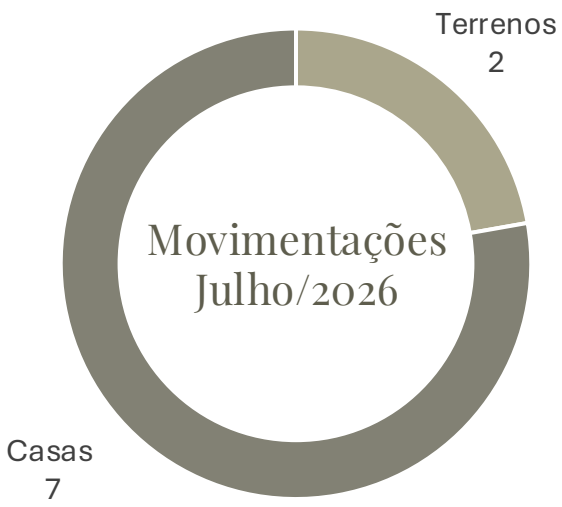

Em julho de 2026, foram identificadas 9 transações no período, sendo 7 unidades residenciais e 2 terrenos.

A equipe de gestão tem observado uma oferta restrita de terrenos disponíveis na região, fator que contribui para a manutenção da atratividade e para o potencial de valorização dos ativos do portfólio.

Paralelamente, o time de gestão segue monitorando, por meio da plataforma proprietária de inteligência de mercado, as regiões com maior potencial de valorização e os níveis médios de preço de venda, buscando acompanhar a dinâmica de oferta e demanda e identificar oportunidades de geração de valor para o portfólio.



05


Composição da Carteira

As imagens são de propriedade do fundo e não podem ser reproduzidas, distribuídas ou divulgadas sem prévia autorização.


Localização
nº ativos
Trancoso (BA)
40%
Fazenda Boa Vista (SP)
60%


Estágio de Maturação
nº ativos
Em Obras
40%
Terreno
60%


Investimento Por Ativo
R$
A Mata - Casa 9
10%
A Mata - Casa 6
10%
Lote 02 Quadra 14
29%
Lote 07 Quadra 04
24%
Lote 01 Quadra 49
27%

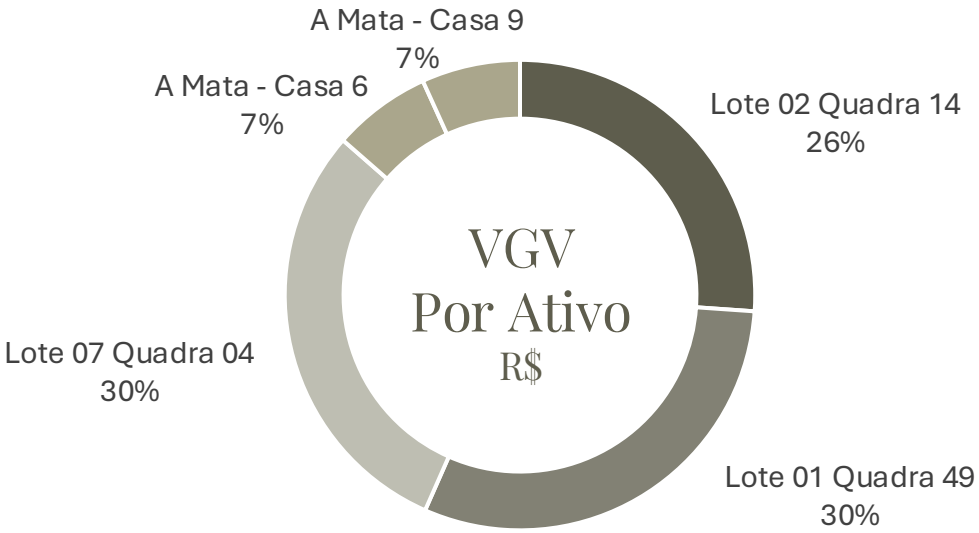
VGV Por Ativo
R$
A Mata - Casa 9
7%
A Mata - Casa 6
7%
Lote 02 Quadra 14
26%
Lote 07 Quadra 04
30%
Lote 01 Quadra 49
30%



FAZENDA BOA VISTA

Lote 02 Quadra 14

38,5 VGV (R$ mi)*

01 unidade

Terreno sem benfeitorias, localizado na Rua Z1, no loteamento Fazenda Boa Vista, em área de expansão urbana de Indaiatuba, com área total de 2.148,46 m².

ADQUIRIDO EM OUT/2025



FAZENDA BOA VISTA

Lote 01 Quadra 49

45 VGV (R$ mi)*

01 unidade

Terreno sem benfeitorias, localizado na Avenida 7, no loteamento Fazenda Boa Vista, em área de expansão urbana de Indaiatuba, com área total de 3.940,41 m².

ADQUIRIDO EM OUT/2025



FAZENDA BOA VISTA

Lote 07 Quadra 04

44 VGV (R$ mi)*

01 unidade

Terreno sem benfeitorias, localizado na Rua F, no loteamento Fazenda Boa Vista, em área de expansão urbana de Indaiatuba, com área total de 3.057,76 m².

ADQUIRIDO EM NOV/2025

** VGV estimado*

As imagens são de propriedade do fundo e não podem ser reproduzidas, distribuídas ou divulgadas sem prévia autorização.



1

TRANCOSO

A Mata – Casa nº 6

10 VGV (R$ mi)*

01 unidade

Unidade autônoma na Rua Projetada, em Trancoso (Porto Seguro/BA), com área de 420,30 m², correspondente à Casa nº 6 do empreendimento “A MATA”.

ADQUIRIDO EM NOV/2025



1

TRANCOSO

A Mata – Casa nº 9

10 VGV (R$ mi)*

01 unidade

Unidade autônoma na Rua Projetada, em Trancoso (Porto Seguro/BA), com área de 420,30 m², correspondente à Casa nº 9 do empreendimento “A MATA”.

ADQUIRIDO EM NOV/2025

** VGV estimado*

Imagens do projeto meramente ilustrativa, sujeitas a alterações.
As imagens são de propriedade do fundo e não podem ser reproduzidas, distribuídas ou divulgadas sem prévia autorização.



06

Acompanhamento de Obras

As imagens são de propriedade do fundo e não podem ser reproduzidas, distribuídas ou divulgadas sem prévia autorização.



A MATA – CASA 06




A MATA – CASA 09

Avanço de Obra

NAMPUR

TRANCOSO - BA


CASA A MATA – 06



Realizado

Fundação	100%
Estrutura	100%
Hidráulica	100%
Fechamentos	90,5%
Elétrica	80%
TOTAL	83,94%

CASA A MATA – 09



Realizado

Fundação	100%
Estrutura	100%
Hidráulica	86,2%
Fechamentos	84,4%
Elétrica	80%
TOTAL	68,23%

Obras em estágio avançado, com refinamentos nas especificações de projeto

As imagens são de propriedade do fundo e não podem ser reproduzidas, distribuídas ou divulgadas sem prévia autorização.

Avanço de Obra

NAMPUR

CASA A MATA – 06 & 09

As obras das Casas 06 e 09 seguem avançando nas etapas finais de execução, com evolução concentrada principalmente em frentes de instalações, fechamentos e acabamentos finos, em linha com o processo de consolidação das frentes executivas previamente reportadas.

Na Casa 06, o avanço físico evoluiu para 83,94% no período, com destaque para o progresso das frentes de acabamento, a instalação das esquadrias e a execução das bancadas, além da continuidade dos cercamentos e dos serviços complementares. A unidade encontra-se em estágio avançado de acabamento, com atividades direcionadas às instalações finais e aos refinamentos previstos nas especificações de projeto, reforçando a consolidação das etapas finais da obra.

Já na Casa 09, o avanço físico evoluiu para 68,23%, com incremento das equipes em campo e retomada de frentes de serviços civis, instalações prediais, bancadas, portas internas, guarda-corpo e forros. No período, também foram conduzidas atividades na casa de máquinas da piscina e intervenções complementares em sistemas e elementos construtivos, contribuindo para a evolução consistente da unidade.

A gestão do Fundo permanece acompanhando a evolução dos trabalhos de forma contínua, em conjunto com a incorporadora e equipes técnicas envolvidas, mantendo monitoramento próximo das etapas em andamento e dos próximos marcos previstos no cronograma executivo.



07

Acompanhamento Pluviométrico

Avaliação Climática


Esta seção registra o acompanhamento do índice pluviométrico, contemplando dados de precipitação e temperatura observados nos municípios de atuação do Fundo: Porto Feliz (SP) e Trancoso (BA). Com base em médias climatológicas de série histórica de 30 anos.

O índice pluviométrico é um dos principais fatores que impactam a evolução física das obras e, por essa razão, é monitorado de forma recorrente. A análise conjunta de precipitação e temperatura permite identificar com maior precisão os períodos de maior e menor incidência de chuvas ao longo do ano.

Em Porto Feliz (SP), o início de 2026 foi marcado por déficit hídrico expressivo nos dois primeiros meses, seguido de uma reversão relevante em março, quando as chuvas superaram significativamente a média histórica. Em julho, a precipitação registrada foi de 32 mm, abaixo da média histórica de 41 mm, indicando um comportamento pluviométrico inferior ao padrão esperado para o período.

Em Trancoso (BA), o período foi marcado por maior variabilidade, alternando meses acima e abaixo da média histórica. A partir de maio, os volumes voltaram a se posicionar acima do padrão esperado. Em julho, a precipitação registrou 210 mm, superando a média histórica de 69 mm para o mês, reforçando um comportamento pluviométrico acima do padrão esperado.


Porto Feliz (SP)

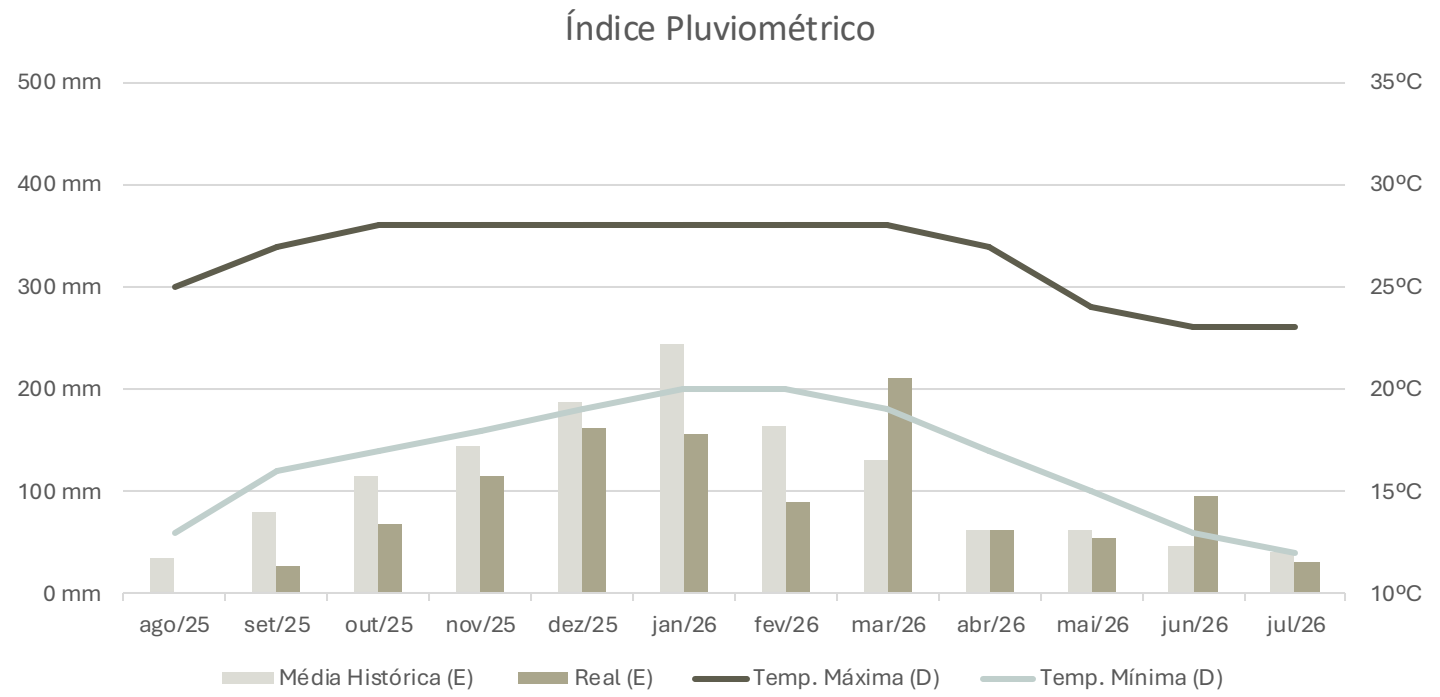

Fontes: Climatempo & Condomínio Fazenda Boa Vista

Em julho de 2026, a precipitação registrada foi de 32 mm, abaixo da média histórica de 41 mm para o mês, indicando um comportamento pluviométrico inferior ao padrão esperado para o período.

Trancoso (BA)

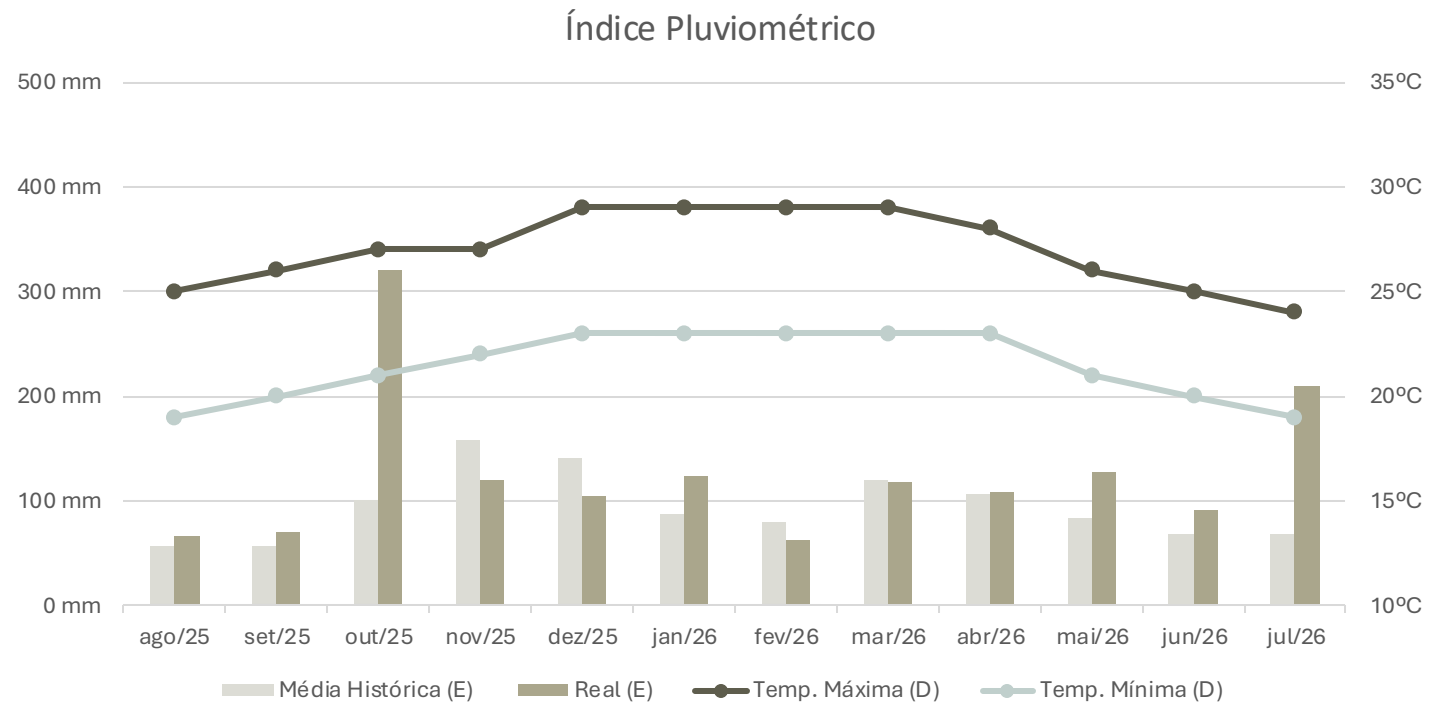

Fonte: Climatempo

Em julho de 2026, a precipitação registrada foi de 210 mm, acima da média histórica de 69 mm para o mês, indicando um comportamento pluviométrico superior ao padrão esperado para o período.




08

Localização

As imagens são de propriedade do fundo e não podem ser reproduzidas, distribuídas ou divulgadas sem prévia autorização.



HOTEL FASANO	ATÉ 4 MIN
BOA VISTA MARKET	ATÉ 4 MIN
SPA FASANO	ATÉ 4 MIN
CAMPO DE GOLFE 1 - RANDALL THOMPSON	ATÉ 6 MIN
ÁREA ESPORTIVA| QUADRAS DE TÊNIS	ATÉ 8 MIN

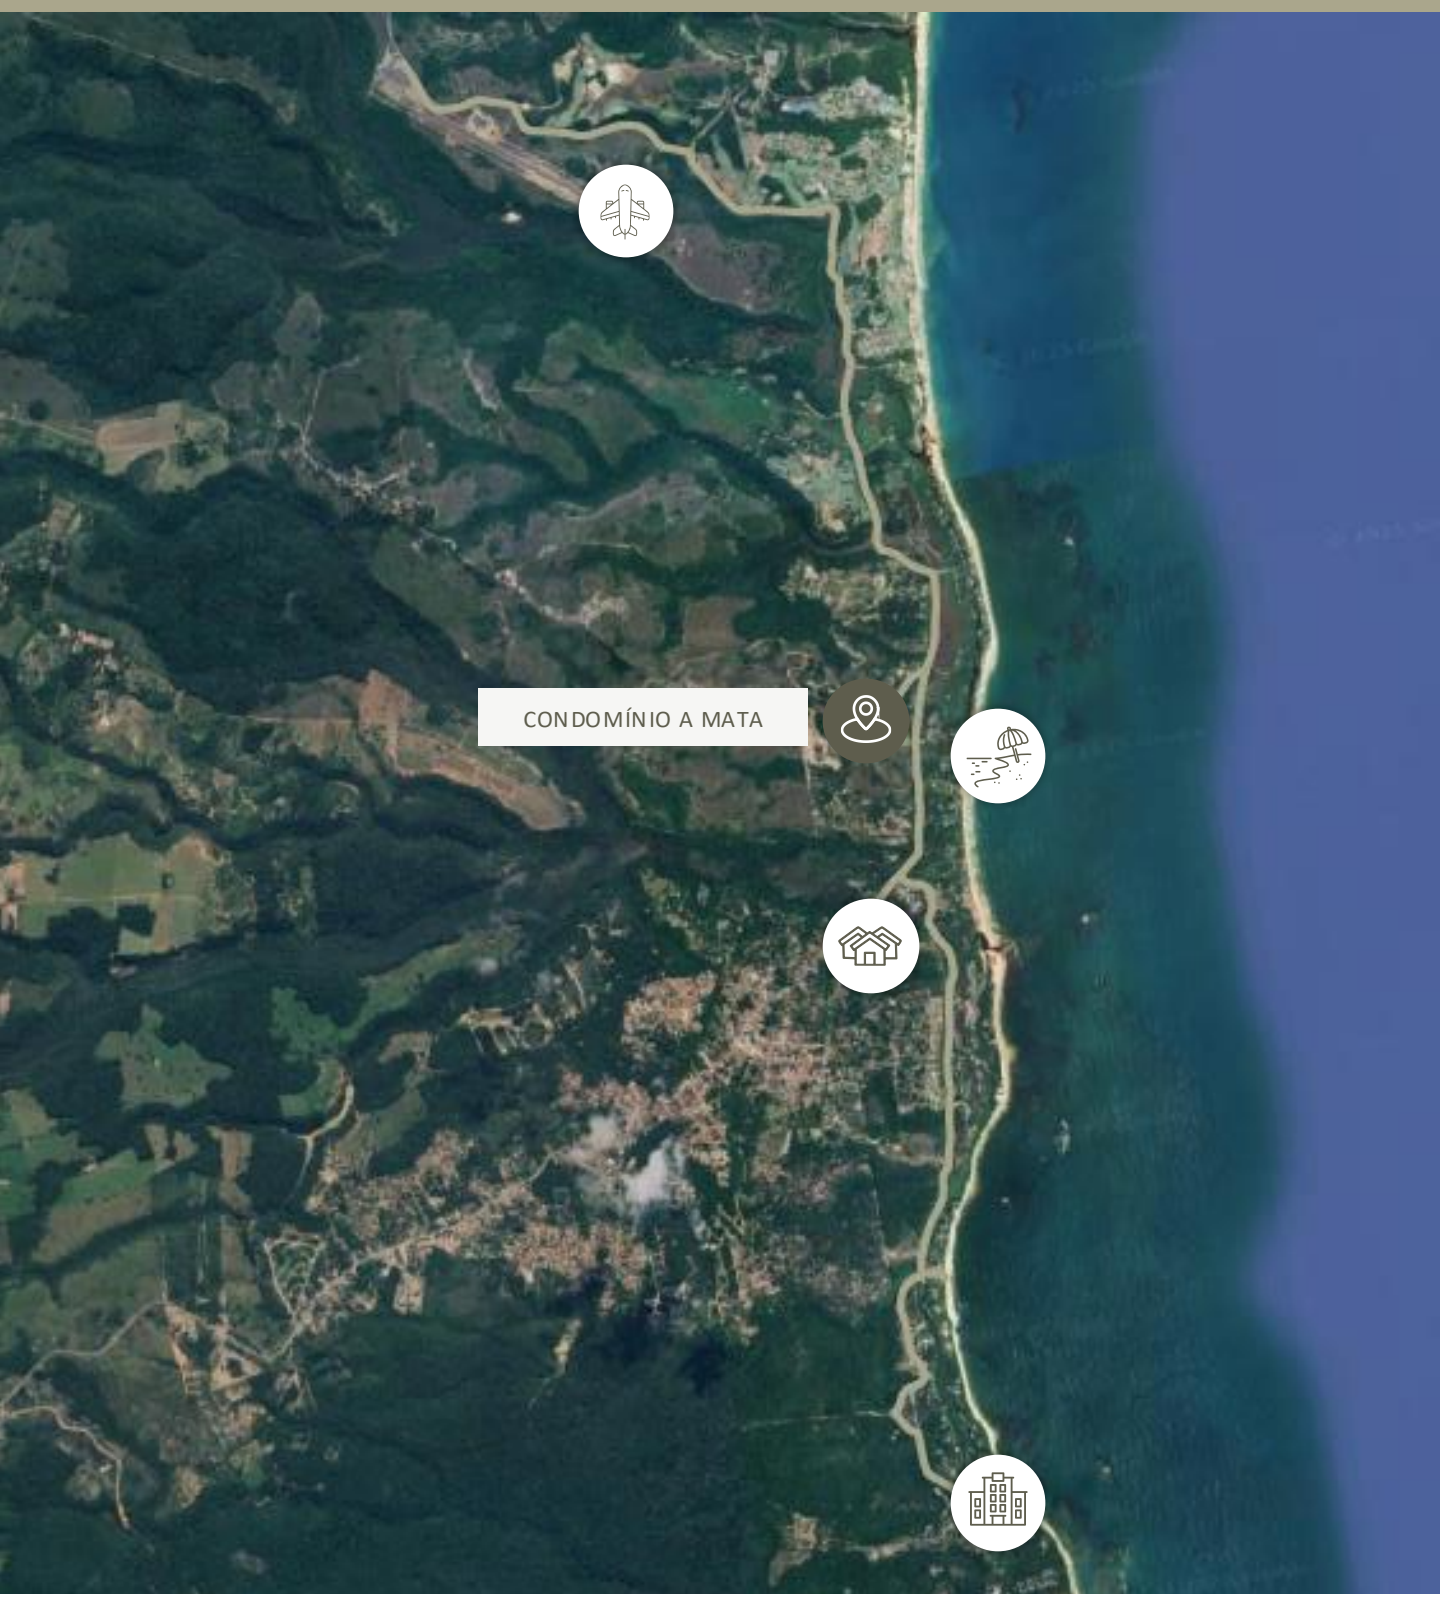

PRAIA DOS NATIVOS	2 MIN
QUADRADO HISTÓRICO	5 MIN
HOTEL FASANO	14 MIN
AEROPORTO TERRAVISTA	19 MIN



09

Ficha Técnica

As imagens são de propriedade do fundo e não podem ser reproduzidas, distribuídas ou divulgadas sem prévia autorização.

Lote 02 - Quadra 14

FAZENDA BOA VISTA

Porto Feliz, São Paulo | Brasil

ÁREA TOTAL	2.148 m²
ÁREA ÚTIL	882 m²
Nº SUITES	6
GYM & WELLNESS	SIM

FOTO AÉREA



FOTOS DO TERRENO









CICLO DO PROJETO - 24 MESES

COMPRA DE TERRENO	INÍCIO OBRA *	FINAL DA OBRA E VENDA *
OUT 25	MAR 26	DEZ 27

** As datas informadas são uma previsão e poderão ser alteradas em função do andamento da obra, condições externas e fatores operacionais.*

Imagens do projeto meramente ilustrativa, sujeitas a alterações.
As imagens são de propriedade do fundo e não podem ser reproduzidas, distribuídas ou divulgadas sem prévia autorização.

Lote 01 - Quadra 49

FAZENDA BOA VISTA

Porto Feliz, São Paulo | Brasil

ÁREA TOTAL	3.940 m²
ÁREA ÚTIL	1.299 m²
Nº SUITES	6
GYM & WELLNESS	SIM


FOTO AÉREA



FOTOS DO TERRENO





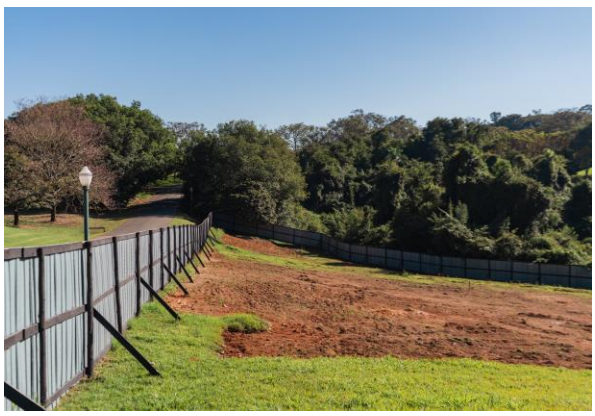



CICLO DO PROJETO - 24 MESES

COMPRA DE TERRENO	INÍCIO OBRA *	FINAL DA OBRA E VENDA *
OUT 25	MAR 26	DEZ 27

** As datas informadas são uma previsão e poderão ser alteradas em função do andamento da obra, condições externas e fatores operacionais.*

Imagens do projeto meramente ilustrativa, sujeitas a alterações.
As imagens são de propriedade do fundo e não podem ser reproduzidas, distribuídas ou divulgadas sem prévia autorização.

Lote 07 - Quadra 04

FAZENDA BOA VISTA

Porto Feliz, São Paulo | Brasil

ÁREA TOTAL	3.058 m²
ÁREA ÚTIL	1.223 m²
Nº SUITES	6
GYM & WELLNESS	SIM

FOTO AÉREA



FOTOS DO TERRENO









CICLO DO PROJETO - 24 MESES

COMPRA DE TERRENO	INÍCIO OBRA *	FINAL DA OBRA E VENDA *
NOV 25	ABR 26	DEZ 27

** As datas informadas são uma previsão e poderão ser alteradas em função do andamento da obra, condições externas e fatores operacionais.*

Imagens do projeto meramente ilustrativa, sujeitas a alterações.
As imagens são de propriedade do fundo e não podem ser reproduzidas, distribuídas ou divulgadas sem prévia autorização.

A Mata – Casa 06

TRANCOSO

Porto Seguro, Bahia | Brasil

ÁREA TOTAL	420 m²
ÁREA ÚTIL	290 m²
Nº SUITES	4
PISCINA PRIVATIVA & SPA	SIM

FOTO AÉREA



FOTOS DO TERRENO









CICLO DO PROJETO - 8 MESES

COMPRA DO IMÓVEL — NOV 25

FINAL DA OBRA E VENDA* — SET 26

** As datas informadas são uma previsão e poderão ser alteradas em função do andamento da obra, condições externas e fatores operacionais.*

Imagens do projeto meramente ilustrativa, sujeitas a alterações.
As imagens são de propriedade do fundo e não podem ser reproduzidas, distribuídas ou divulgadas sem prévia autorização.

A Mata – Casa 09

TRANCOSO

Porto Seguro, Bahia | Brasil

ÁREA TOTAL	420 m²
ÁREA ÚTIL	290 m²
Nº SUITES	4
PISCINA PRIVATIVA & SPA	SIM

FOTO AÉREA



FOTOS DO TERRENO









CICLO DO PROJETO - 8 MESES

COMPRA DO IMÓVEL — NOV 25

FINAL DA OBRA E VENDA * — SET 26

** As datas informadas são uma previsão e poderão ser alteradas em função do andamento da obra, condições externas e fatores operacionais.*

Imagens do projeto meramente ilustrativa, sujeitas a alterações.
As imagens são de propriedade do fundo e não podem ser reproduzidas, distribuídas ou divulgadas sem prévia autorização.

Disclaimer

Este material possui caráter exclusivamente informativo e tem como objetivo a divulgação de informações, não constituindo, em qualquer hipótese, oferta pública de venda, solicitação de oferta, recomendação de investimento em valores mobiliários ou material de distribuição pública nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As informações aqui contidas não devem ser utilizadas como única base para a tomada de decisão de investimento. Recomenda-se que o investidor realize avaliação própria e criteriosa dos produtos e riscos envolvidos, considerando seus objetivos pessoais e seu perfil de risco (“suitability”), bem como a leitura atenta do regulamento, do Formulário de Informações Complementares e dos demais documentos oficiais do fundo. Os ativos mencionados integram o patrimônio do Fundo de Investimento Imobiliário Triplo A Residencial (TRIP11), devidamente regulado pela CVM, sendo que informações adicionais e atualizadas devem ser consultadas exclusivamente nos documentos oficiais do Fundo. As opiniões, estimativas e projeções expressas neste material refletem o entendimento na presente data e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Rentabilidade passada não representa, nem deve ser interpretada como garantia de rentabilidade futura. Investimentos em fundos imobiliários não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Disclaimer

As imagens, perspectivas, ilustrações, plantas e renderizações apresentadas possuem caráter meramente ilustrativo e preliminar, podendo não refletir o produto final. Projetos, especificações, áreas, layouts e demais características poderão sofrer alterações, inclusive substanciais, sem aviso prévio, em decorrência de evoluções de projeto, compatibilizações técnicas, exigências legais, regulatórias ou decisões de desenvolvimento, não constituindo, portanto, obrigação ou garantia quanto ao produto final a ser entregue. Todos os direitos autorais relativos aos projetos são reservados, sendo que quaisquer modificações, adaptações ou reutilizações dependem de prévia anuência do escritório autor.

Todas as imagens, perspectivas, renderizações, plantas e materiais gráficos constantes deste documento são de propriedade exclusiva do Fundo de Investimento Imobiliário Triplo A Residencial (TRIP11). É expressamente proibida a reprodução, distribuição, publicação, veiculação, inclusive em redes sociais, ou qualquer forma de utilização por terceiros, incluindo corretores, intermediários, parceiros ou prestadores de serviço, sem autorização prévia e por escrito da gestora. O uso não autorizado sujeitará o infrator às medidas legais cabíveis, nas esferas cível e criminal.



“Triplo A Residencial: valor além do metro quadrado.”

Open Kapital

OPENKAPITAL.COM.BR/FUNDO/TRIP11/

TRIP11@OPENKAPITAL.COM.BR

CADASTRE-SE NO MAILING

+55 11 2359 6456

COMUNIDADE NO WHATSAPP

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

NAMPUR

TRIP11
