



Fundo de Investimento Imobiliário Hospital Unimed Campina Grande

► Relatório da Administração

► Setembro/2024

Informações Gerais

O Fundo de Investimento Hospital Unimed Campina Grande foi constituído em 05 de outubro de 2020 com o objetivo de captar recursos junto ao público investidor para desenvolvimento de um empreendimento imobiliário com destinação hospitalar a ser desenvolvido no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba. Após a conclusão das obras o imóvel será locado para Unimed Campina Grande Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

A primeira emissão de cotas do Fundo foi realizada por meio de Oferta Pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476/2009, com a colocação de 105.000 cotas ao preço unitário de R\$ 100,00 por cota, totalizando a captação de R\$ 10.500.000,00. A primeira emissão teve por objetivo captar recursos suficientes para aquisição do terreno, desenvolvimento dos projetos de construção do empreendimento hospitalar e custeios das despesas do fundo nos dois primeiros anos de operação

Com a conclusão da Oferta foram contratados os serviços de arquitetura para elaboração do projeto, e em 10 de março de 2021 o fundo concluiu a aquisição de um terreno de 12.000m² situado Dr. Elpídio de Almeida, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, objeto da Matrícula 139.674 do 1º Serviço Notarial e Registral Ivandro Cunha Lima, da Comarca de Campina Grande – PB, pelo valor de R\$ 7.200.200,00, que acrescidos dos impostos e encargos, totalizou o montante de 7.368.000,00

A segunda emissão de cotas do Fundo foi realizada por meio de Oferta Pública destinada ao público em geral, nos termos da Instrução CVM nº 400/2003. A Oferta foi concluída em 03 de maio de 2022 com a colocação de 1.017.000 cotas ao preço unitário de R\$ 100,00 por cota, totalizando a importância de R\$ 101.700.000,00. Além do preço por cota, foi cobrado dos investidores participantes da segunda oferta a Taxa de Distribuição Primária no valor de R\$ 2,67 destinada a suprir os custos da Oferta. Com o encerramento da Oferta as cotas do Fundo foram levadas a registro na B3, tendo sido atribuído o valor de R\$ 102,67 por cota para início das negociações em 10 de maio de 2022.

Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário Hospital Unimed Campina Grande

CNPJ: 39.347.413/0001-82

Administrador: Coinvalores Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda.

Gestor: Investcoop Asset Management Ltda.

Escriturador: Banco Daycoval S.A

Código de Negociação: HUCG11

Taxa Administração: 0,60% ao ano sobre o PL (mínimo mensal de R\$ 23.000,00) + parcela variável ref. taxa escrituração de R\$ 1,60 por cotista (mínimo mensal de R\$ 3.341,14 e valor máximo R\$ 16.000,00).
Obs. valores corrigidos pelo IGP-M

Taxa de gestão: 0,10% ao ano sobre o PL;

Cotas emitidas: 1.122.000

Cota Patrimonial: R\$ 103,7642 - PL Setembro/24

Cota de mercado: R\$ 84,31 - Base cota de fechamento Setembro/24

Demais características.

FII Hospital Unimed Campina Grande

CNPJ/MF nº 39.347.413/0001-82

Tipo ANBIMA: Desenvolvimento para Renda Gestão Passiva

Segmento de Atuação: Hospital

Código ISIN das Cotas: BRHUCGCTF004

Código de Negociação na B3: HUCG11


Nome de Pregão: FII UNIMED C

Início das Negociações - B3

Em 10 de maio de 2022 as cotas oriundas das 1ª e 2ª emissões ficaram disponíveis para negociação no ambiente da B3 “Início de negociação” sob o código de negociação **HUCG11**, código Isim **BRHUCGCTF004** e pelo valor unitário de R\$ 102,67 (cento e dois reais e sessenta e sete centavos).



Histórico do Fundo

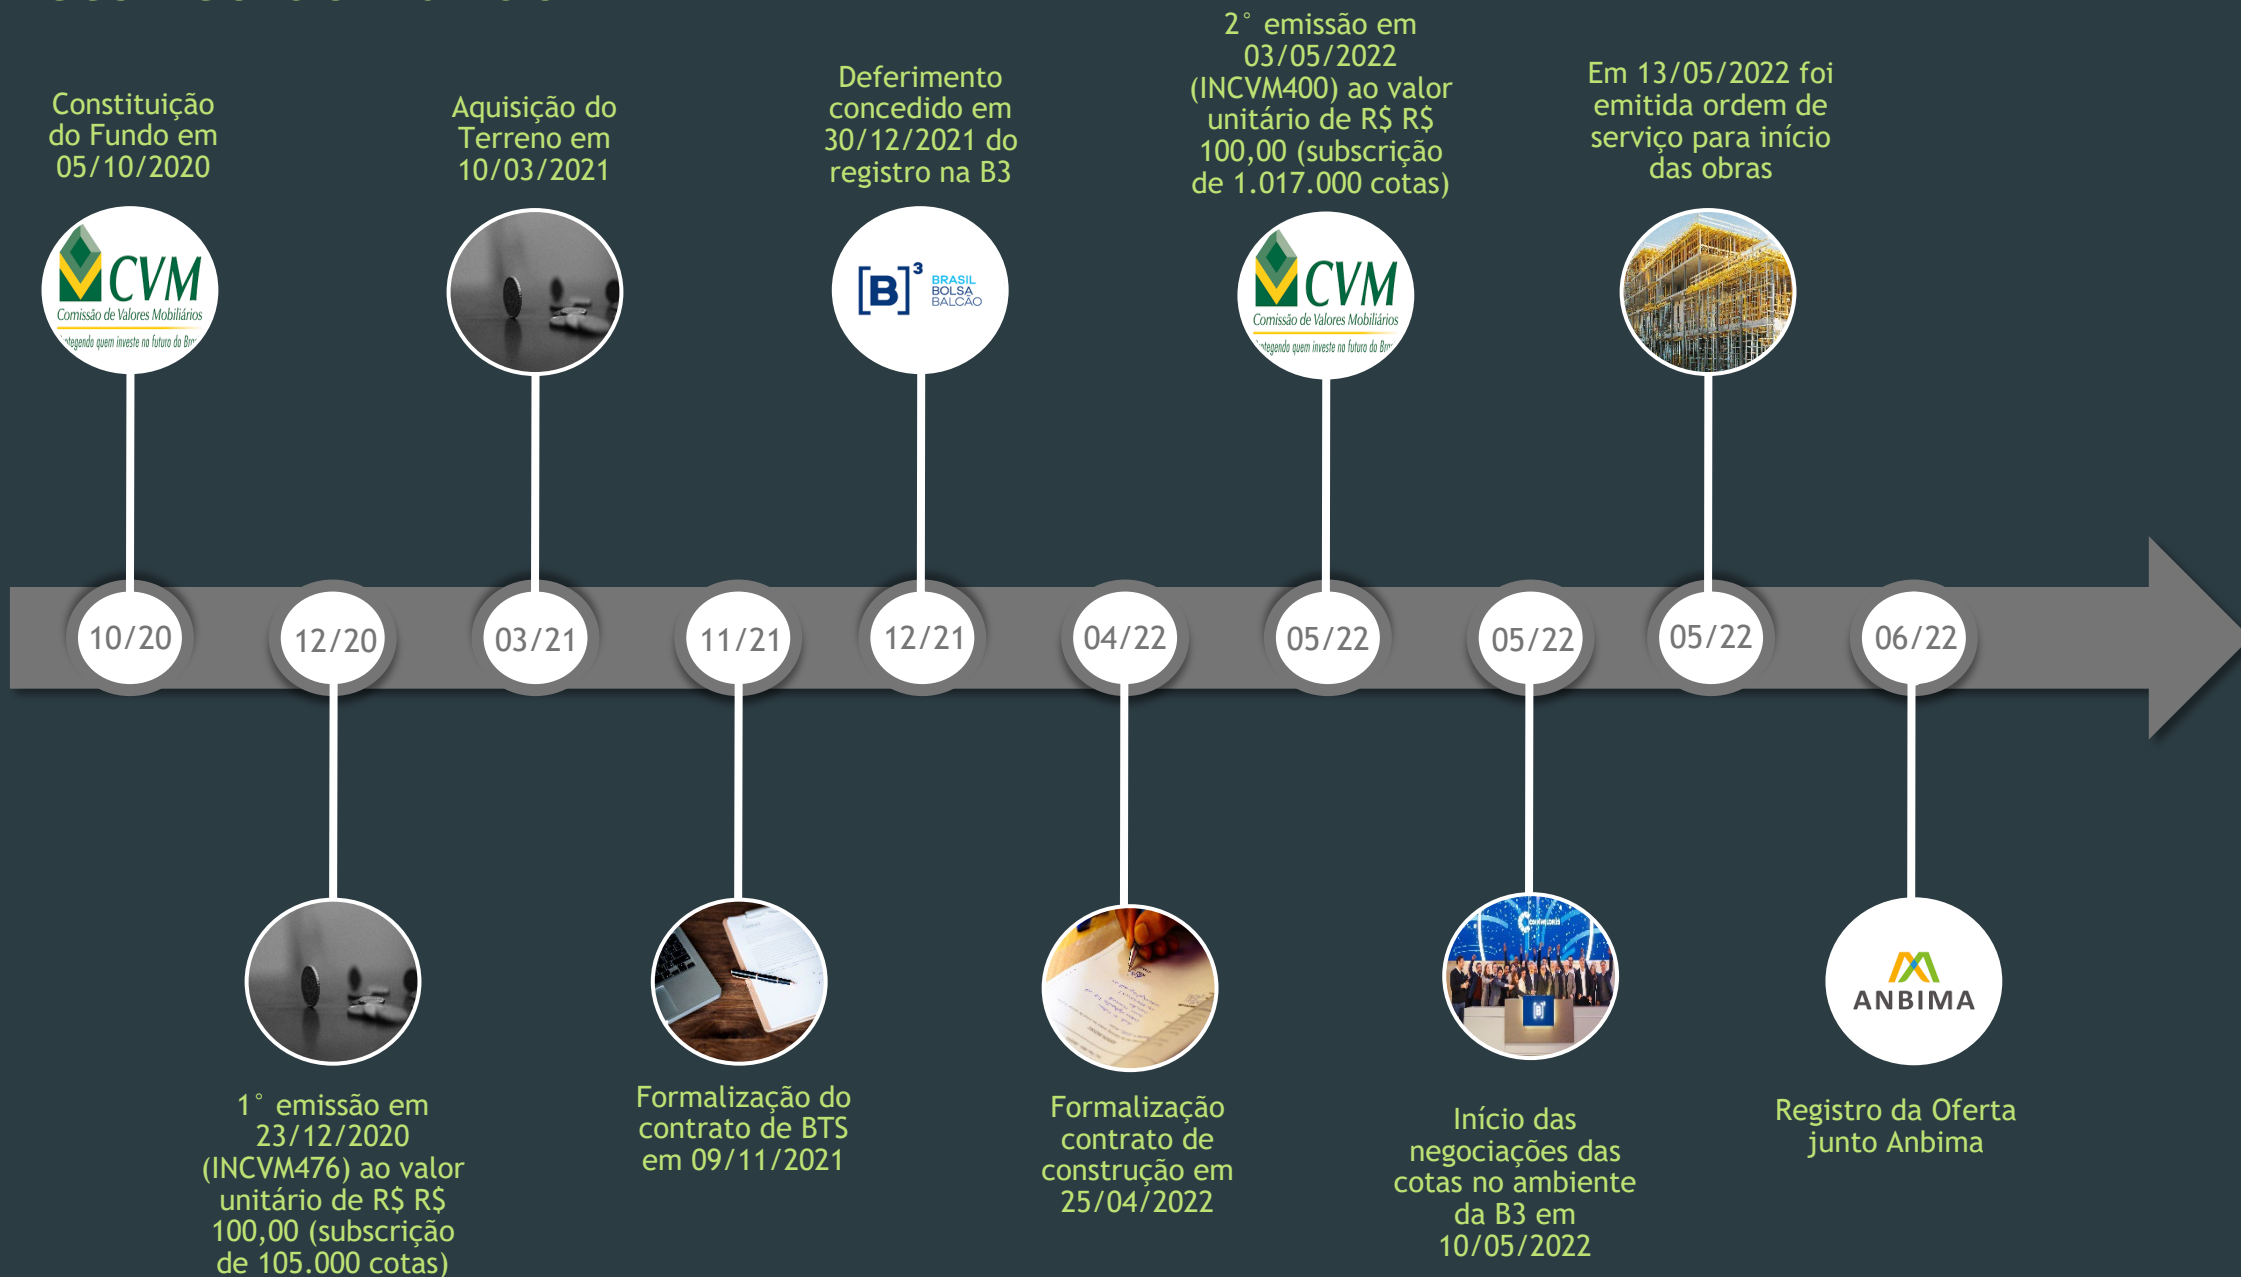

Fato Relevante

Abaixo reproduzimos o teor do Fato Relevante divulgado em 30 de outubro de 2024.

COINVALORES CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 00.336.036/0001-40, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.800, Edifício Liége – conjuntos 21 e 22 - 2º andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-001 (“Administradora” ou “Coinvalores”), na qualidade de administradora do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED CAMPINA GRANDE**, inscrito no CNPJ sob o nº 39.347.413/0001-82 (“Fundo”), em cumprimento ao disposto no Artigo 41, IV, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 472, de 31 de outubro de 2008 (texto consolidado conforme alterações), comunica aos cotistas e ao mercado em geral o quanto segue:

No Fato Relevante divulgado em 23 de setembro de 2024 informamos que a construtora não havia concluído a obra em meados de setembro como havia se comprometido. Na oportunidade relatamos que, embora a construtora insistisse em afirmar que poderia concluir a obra até o final de outubro, de acordo com a Gerenciadora, dificilmente a obra seria concluída antes de 30 de novembro de 2024.

Assim, considerando que a obra não seria concluída em outubro, e considerando a necessidade de formalizar o novo prazo, de forma a possibilitar a renovação dos seguros da obra, foi acordado o novo prazo para entrega da obra em 30 de novembro de 2024.

A construtora também havia dito que independente do atraso do prazo para conclusão da obra, os prazos para obtenção do AVCB e Habite-se não seriam prejudicados, e poderiam ser obtidos até o final de outubro.

Agora a construtora informou que não será possível obter os referidos documentos até o final de outubro, e de acordo com a nova programação, a obtenção do AVCB está prevista para 21/11/24 e o Habite-se até 29/11/24 mantida a data de conclusão da obra até 30 de novembro de 2024. De acordo com a Gerenciadora da obra em 14 de outubro de 2024 o avanço da obra era de 95%.

A Gerenciadora e o grupo Gestor estão acompanhando a execução das atividades de acordo com o planejamento semanal apresentado pela construtora, e têm constatado, com preocupação, desvios que, se não forem corrigidos pela construtora, podem, mais uma vez, comprometer o cronograma de entrega da obra.

Sendo o que nos cabia para o momento, a Administradora fica à disposição de V.Sas. para eventuais esclarecimentos adicionais.

Início das Obras

Em 25 de abril foram formalizados os contratos de Construção e Gerenciamento da Obra, e no dia 13 de maio de 2022 foi emitida a Ordem de Serviço para Início das obras, que inicialmente deveriam ser concluídas no prazo de 18 meses, no entanto, conforme detalhado no Fato Relevante divulgado em 23/09/2024, o prazo foi prorrogado para 29/11/2024. Apesar a postergação dos prazos para entrega do AVCB e do Habite-se, o prazo para conclusão foi mantido para 29/11/2024.





Imagens ilustrativas produzidas pela EMED Arquitetura e Planejamento Ltda. (2021), empresa contratada pelo Fundo para elaboração dos projetos

Hospital Unimed

O Hospital Unimed Campina Grande terá 15.740m² de área construída e contará com 127 Leitos, 10 Leitos de UTI Adulto e 10 Leitos de UTI Infantil, Pronto Atendimento - PA, Serviços de Diagnósticos por imagem e Exames Laboratoriais.

Locação

Após a conclusão das obras o imóvel será locado para Unimed Campina Grande Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., por meio de Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial sob a Modalidade “ Built to Suit” com Opção de Compra e Outras Avenças, já formalizado entre as partes em 09 de novembro de 2021 com as seguintes características:

Prazo: 20 anos

Vigência: Inicialmente estava previsto o início em 01/01/2024, no entanto, considerando a nova previsão de entrega da obra, caso se confirme a entrega física e do obtenção do AVCB e do habite-se até 30/11/2024, a locação terá início em 01/12/2024.

Valor do Aluguel: R\$ 844.461,00

Índice de Correção: IPCA (base novembro/2021)

Opção de Compra: A cada aniversário de 5 anos. O preço de aquisição será estabelecido de acordo com a média aritmética dos valores de avaliação do imóvel indicados em três laudos, elaborados em conformidade com os termos da Instrução CVM 472 por três empresas avaliadoras distintas, dentre os nomes indicados no anexo V do contrato de locação sendo uma escolhida por cada parte e a terceira de comum acordo.

Garantia: Fiança Bancária correspondente a 18 meses de locação.



Informações contábeis




Valor da cota patrimonial
R\$ 103,7642



Valor da cota de mercado (fechamento)
R\$ 84,31

ATIVO em milhares de reais

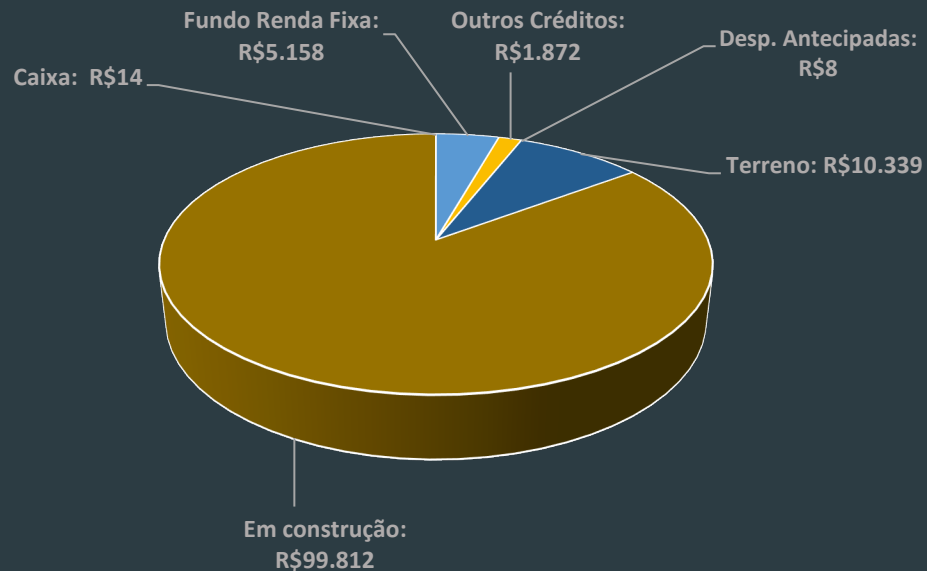

Passivo em milhares de reais

Fiscais e previdenciários	R\$ 9
Taxa de administração a pagar	R\$ 58
Taxa de gestão a pagar	R\$ 10
Contas a pagar p/conta de obras	R\$ 686
Outros valores a pagar	R\$ 16

R\$ 779

Patrimônio Líquido em milhares de reais

Total Ativo R\$	117.203
Total Passivo R\$	-779
P.L R\$	116.424

Obs. O balancete contábil está disponível através dos sites da Coinvalores; <https://coinvalores.com.br/> e B3 https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/

Fluxo de caixa

	Início do mês	Acumulado no ano
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Receita de Aplicação Financeira	44.910,92	793.100,58
Taxa de administração/gestão/escrituração	(71.283,54)	(554.337,48)
Despesas Tributárias	(6.736,59)	(105.647,28)
Taxa B3, Anbima, CVM e outros	-	(35.220,52)
Serviços Técnicos e especializados, cartórios e outros	(15.581,18)	(266.080,38)
Caixa líquido das atividades operacionais	(48.690,39)	(168.185,08)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Pagamento por conta de obras	(371.483,70)	(11.266.516,65)
Outros pagamentos por conta de obras	(57.234,69)	(187.819,24)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(428.718,39)	(11.454.335,89)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Distribuição de rendimentos	-	(246.840,00)
Outros Valores não Operacionais	-	0,01
Caixa líquido das atividades de financiamentos	-	(246.839,99)
Variação líquida do caixa	(477.408,78)	(11.869.360,96)
Caixa início do período	5.648.677,64	17.040.629,82
Caixa final do período	5.171.268,86	5.171.268,86

Valor de mercado dos bens integrantes do Patrimônio Líquido

De acordo com a avaliação técnica realizada pela empresa Cushman & Wakefield, o valor de mercado do terreno foi avaliado com base em laudo de dez/23 no valor de R\$ 10.339.481,80 que acrescidos das medições, realizadas desde o início da obra em maio de 2022, e dos custos de projetos, totalizam R\$ 110.151.243,41

Premissas O terreno foi avaliado utilizando o método de Comparativo de Dados de Mercado. A Edificação seguiu o critério de custos de aquisição de acordo com os valores das medições ocorridas até Setembro/24	Laudo de Avaliação				
	Imóvel	Valores em 2021	Medições	Valorização / desvalorização	Valor Atual laudo 2024
	Terreno	9.940.000,00	-	399.481,80	10.339.481,80
	Edifício construções	-	96.060.783,55	-	98.837.831,05
	Edifício projetos	973.930,56	-	-	973.930,56
	Total	10.913.930,56	96.060.783,55	399.481,80	110.151.243,41
	Resultado por cota	<u>9,73</u>	<u>85,62</u>	<u>0,36</u>	<u>98,17</u>

Dividend Yield

► Em 30/09/2024, foi informado aos cotista que no fechamento do mês de maio não haveria distribuição de resultado. Esse comunicado está disponível em nosso site e também na B3.

<https://coinvalores.com.br/investimentos/fundos-imobiliarios/unimed-campina-grande>.

https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/

Andamento das obras

Durante o mês de setembro seguiram-se as atividades: revestimento de pele de vidro e ACM, instalações hidráulicas, esgoto, instalações elétricas, gases medicinais e diversas outras atividades de acabamento, como, pintura, instalação de piso vinílico, louças e metais e bate maca. De acordo com a medição realizada pela gerenciadora, em 14/10/2024 o avanço físico atingido foi de 95%. Além disso, existem itens de não conformidade que precisam ser sanados até o final da obra.



Andamento das obras

Para suprimento da obra, até o final do mês de setembro foram contratados para faturamento direto o montante de R\$ 76.987.293,13 correspondente a compra de insumos e contratação de serviços especializados. Deste montante, já foram pagos até 30/09/2024 R\$ 75.706.702,98 e o saldo será faturado de acordo com a entrega/medição, para pagamento nos próximos meses de acordo com os prazos acordados.

Fachada




Andamento das obras

ACM



Andamento das obras




Piso Vinílico



Andamento das obras

Visão Geral de um Andar




Andamento das obras

Identificações - AVCB



Andamento das obras


Instalações de Visores e bate macas e cantoneiras



Marcenaria do Shaft



Instalação dos Fancoils

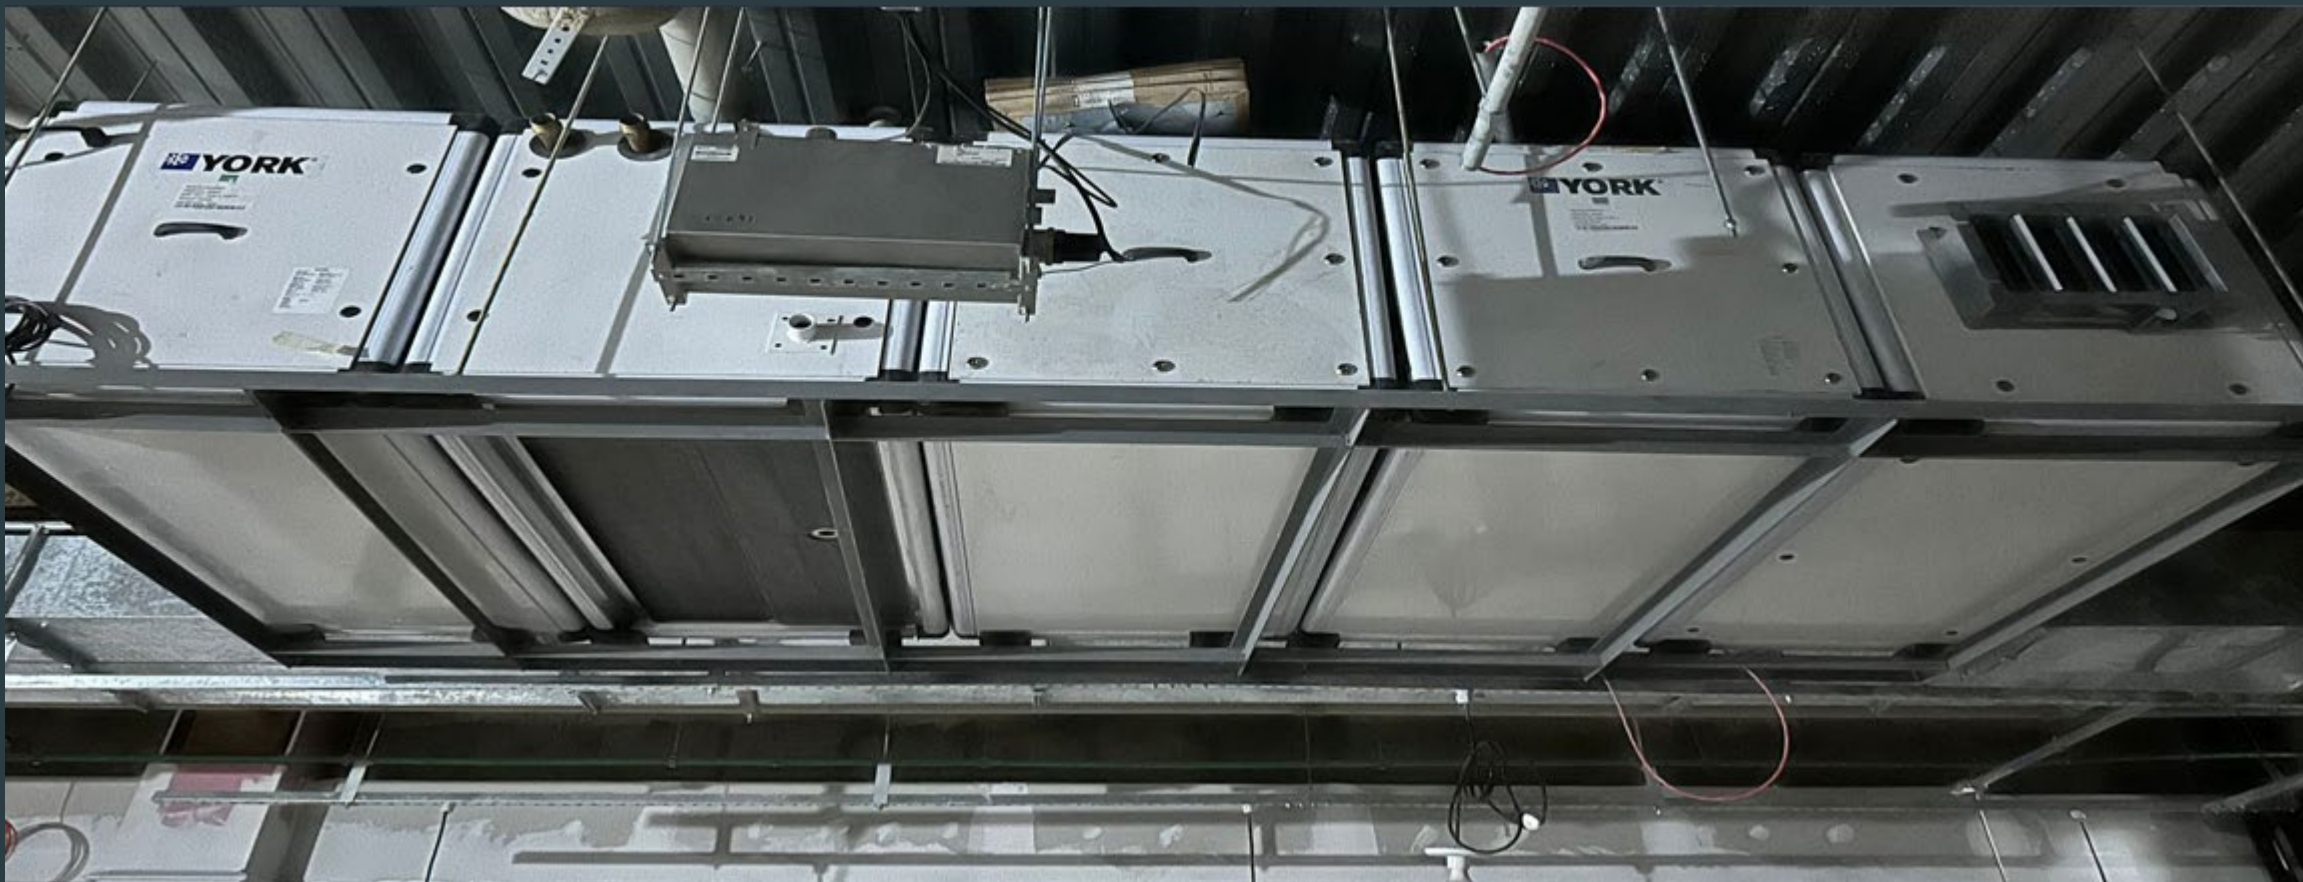



Contatos RI

website: www.coinvalores.com.br

e-mail: admfundoimobiliario@coinvalores.com.br

Tel (11) 3035-4143

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1800 - 2° andar Edifício Liêge

Cep. 01451-001 - são Paulo SP
